


⑭ 平成27年度 茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤根固工事

1. 工 期：平成27年4月21日～平成27年7月30日
2. 施工場所：常陸那珂港区 (請負金額：¥19,753,200-)
3. 受 注 者：(株)大曽根建設
4. 工事内容：東防波堤根固ブロックH=1.6m 24個 H=1.2 14個を製作する工事である。
5. 工事進捗状況(6/24日現在)

工事全体の進捗率
(計画82.4%、実施82.4%)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	設計数量	計画数量	実施数量	進捗率	備考
準 備 工		式	1.0	1.0	1.0	100%	6/24現在
根固ブロック製作1	L5.0m×B2.5m×H1.6m	個	24.0	24.0	24.0	100%	打設完了数
根固ブロック製作2	L4.0m×B2.5m×H1.2m	個	14.0	12.0	12.0	85.7%	型枠解体
跡 片 付		式	1.0	0.0	0.0	0%	

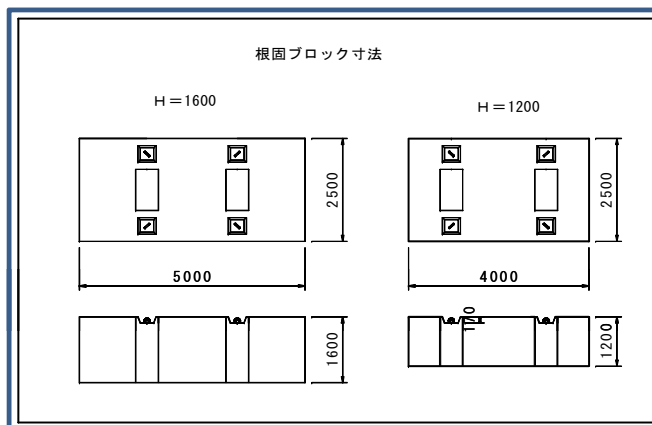


生コンクリート打設状況



<工事状況写真>
6月24日現在



型枠組立状況


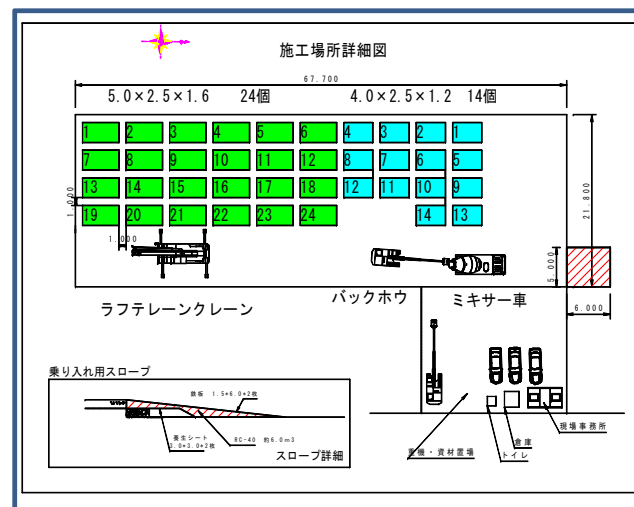


⑮ 平成27年度 茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤築造工事

1. 工 期 平成27年5月7日 ～ 平成28年3月22日
2. 施 工 場 所 常陸那珂港区内 (請負金額 ¥745,200,000 - (税込み))
3. 受 注 者 東洋・秋山特定建設工事共同企業体
4. 工 事 内 容 茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤の、基礎工、本体工、根固工、上部工及び仮設工を施工する工事である。
5. 工事進捗状況 (6月24日現在)

工事全体の進捗率
(計画 9.5 % 実施 9.8 %)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	設計数量	実施数量	進捗率
基礎工					
基礎捨石	30～800Kg/個程度	m3	10,558	6,860	65%
捨石本均し	±5cm	m2	2,047	0	0%
捨石荒均し	±50cm	m2	1,516	0	0%
本体工					
吊り金具取付		箇所	24	12	50%
ケーソン掘付		箇	2	0	0%
ケーソン中詰(1)	砂又は岩ズリ等	m3	19,140	0	0%
ケーソン中詰(2)	玉砂利	m3	1,200	0	0%
ケーソン中詰均し		m2	1,320	0	0%
蓋コンクリート	18N-8-40	m3	660	0	0%
被覆・根固工					
被覆石	800～1,000Kg/個程度	m3	1,450	0	0%
被覆石均し	±50cm	m2	1,112	0	0%
根固ブロック撤去仮置		個	14	0	0%
根固ブロック撤去掘付		個	14	0	0%
根固ブロック掘付		個	36	0	0%
上部工					
上部コンクリート(1)	18N-8-40	m3	1,516	0	0%
上部コンクリート(2)	18N-8-40	m3	683	0	0%

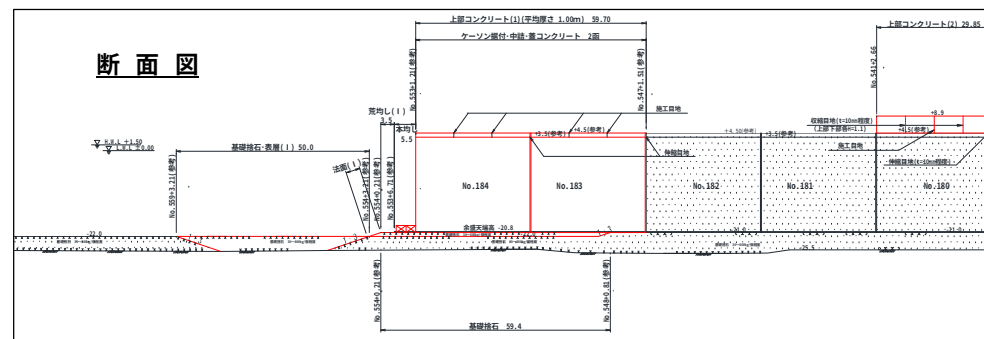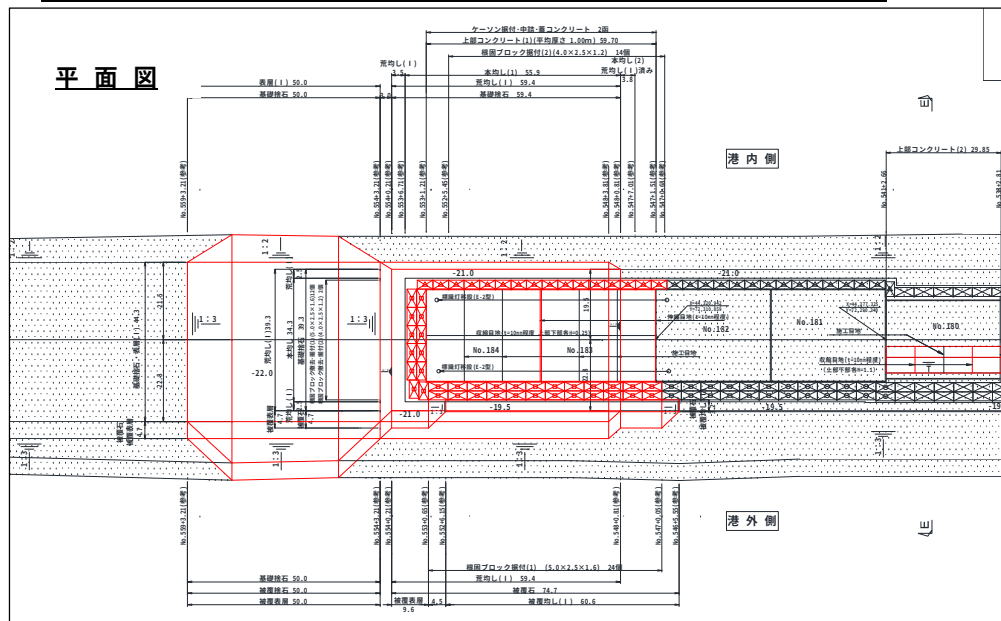

<工事状況写真>

