

工事進捗状況（平成27年2月23日現在）

No.	工事件名	契約	予定工期		請負金額	請負者	進捗率(%)		記 事
			自	至			計画	実績	
【常陸那珂港区外港地区】									
⑩ 本官	平成26年度 常陸那珂港区外港地区東防波堤築造工事	変	平成26年6月12日	平成27年3月27日	¥615,600,000	東亜建設工業(株)	97.0%	91.0%	完成検査3/27予定
⑪	平成26年度 常陸那珂港区外港地区東防波堤基礎工事	変	平成26年9月2日	平成27年3月20日	¥236,358,000	東亜建設工業(株)	92.0%	78.0%	完成検査3/31予定

⑩ 平成26年度 茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤築造工事


1. 工期：平成26年6月12日～平成27年3月27日（指定部分工期：平成26年11月28日）
2. 施工場所：茨城港常陸那珂港区内（請負金額：¥615,600,000-）
3. 受注者：東亜建設工業株式会社 10月14日変更契約
4. 工事内容：茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤のケーソン2基を据え付ける工事である。
5. 工事進捗状況（平成27年2月23日現在）

工事全体の進捗率
（計画97.0%、実施91.0%）

<工事数量>

工事名称	規格寸法	単位	設計数量	実施数量	進捗率
【指定部分】					
基礎工	30～800kg/個程度	m3	2,913	2,913	100%
本体工（ケーソン式）	7,866t/函	函	2	2	100%
【指定部分以外】					
基礎工	30～800kg/個程度	m3	7,980	6,870	86%
被覆・根固工	800～1000kg/個程度	m3	1,562	781	33%
上部工		m3	1,529	1,529	100%


<断面図>

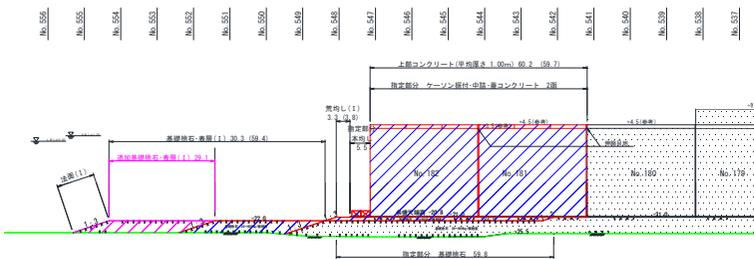

最終コンクリート打設及び荒均し状況 2月10日撮影



<平面図>

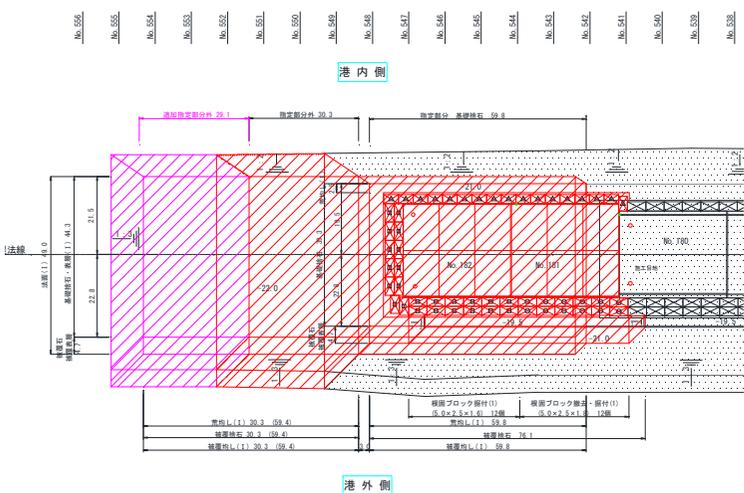

<工事状況写真>

荒均し施工状況検査 2月12日撮影



上部工完了 2月17日撮影




⑪ 平成26年 茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤基礎工事

1. 工期：平成26年9月2日～平成27年3月20日
2. 施工場所：常陸那珂港区内（請負金額：¥236,358,000-）
3. 受注者：東亜建設工業(株)
4. 工事内容：本工事は、茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤の基礎工、被覆工を施工するものである。
5. 工事進捗状況(2月19日現在)

工事全体の進捗率
(見直し計画92.0%、実施78.0%)


工種	規格寸法	単位	設計数量	実施数量	進捗率
基礎工					
基礎捨石	30~800kg/個程度	m ³	17,201	16,471	95.8%
捨石荒均し(I)	±50cm	m ²	1,677	976	58.2%
被覆工					
被覆石	800~1,000kg/個程度	m ³	1,470	0	0.0%
被覆均し(I)	±50cm	m ²	979	0	0.0%

基礎工、被覆工施工範囲図

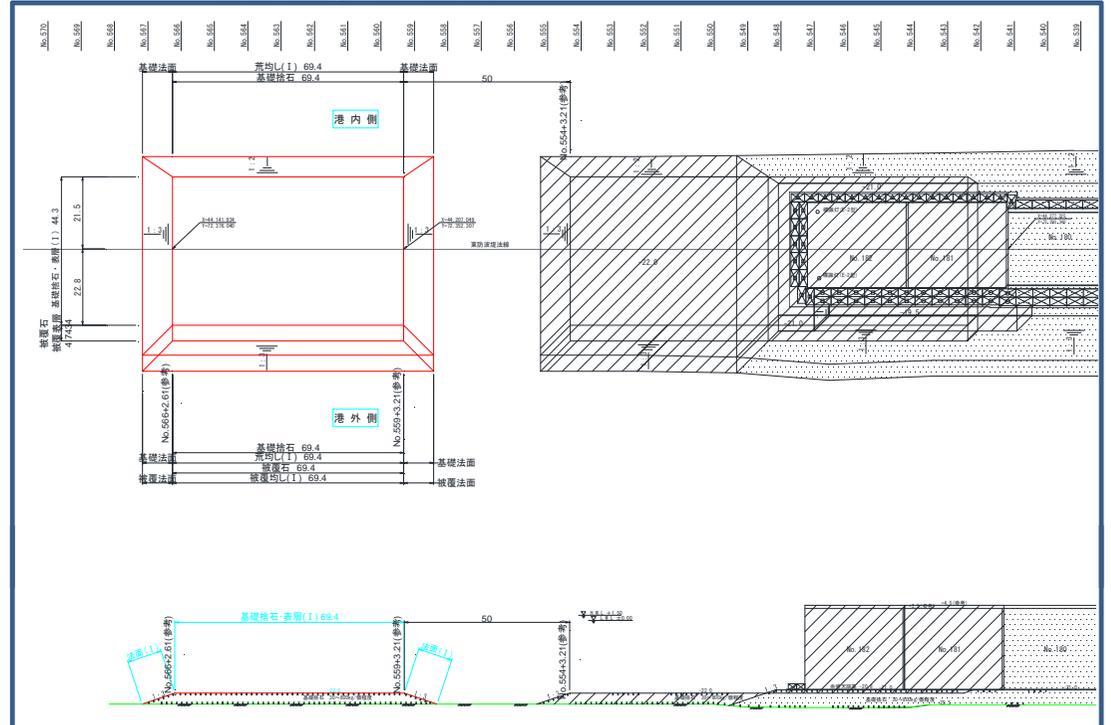

<工事状況写真>

基礎工 捨石荒均し水中部施工状況検査 (2月12日撮影)

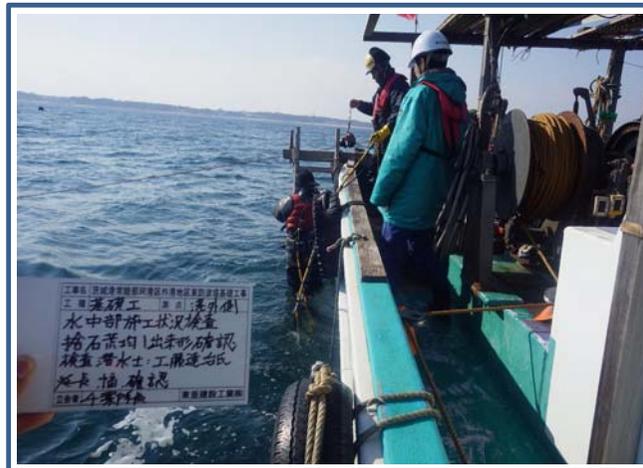

基礎工 基礎捨石投入状況(19隻目) (2月15日撮影)

