




京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(V工区)高架橋上部工事  
 工期 平成25年7月11日～平成27年10月9日  
 施工会社 宮地・三菱特定建設工事共同企業体  
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるV工区高架橋上部工において、IVP6～VP6間の橋梁上部工 上・下線2連を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図

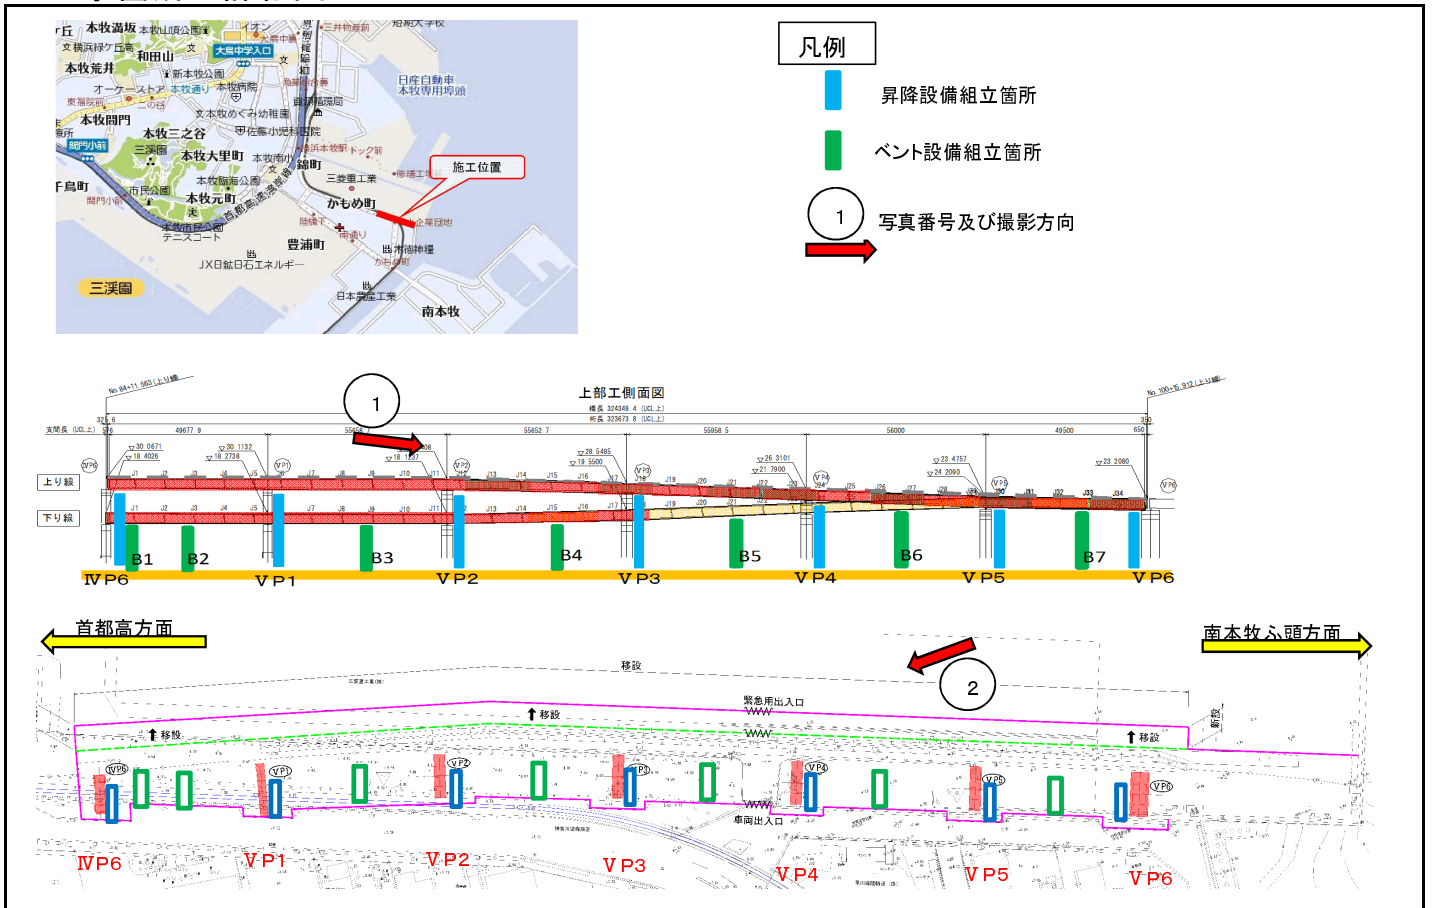

●今月の工事予定

| 内容         | 平成27年1月 |    |    |    |    |    | 備考 |
|------------|---------|----|----|----|----|----|----|
|            | 5       | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |    |
| 上り線 床版工    |         |    |    |    |    |    |    |
| 上り線 添接部塗装工 |         |    |    |    |    |    |    |
| 下り線 架設工    |         |    |    |    |    |    |    |
| 下り線 足場工    |         |    |    |    |    |    |    |
|            |         |    |    |    |    |    |    |
|            |         |    |    |    |    |    |    |

●お知らせ

平成26年6月から高架橋上部工事の架設作業を進めています。  
 平成27年1月度は下り線の架設作業がVP6まで完了予定で全体の架設完了となります。架設完了後、現場添接部の高力ボルト本締め作業に移ります。  
 上り線は床版コンクリートの打設作業を数回に分けて順次進めていく予定です。また、1月末頃より上り線の現場添接部の塗装作業に入る予定です。  
 近隣の皆様にはご不便をお掛けしますが、本事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

写真① 今月の作業内容

写真①

H26,12月時点：上り線の床版コンクリート打設前状況、1月度予定：床版コンクリート打設作業



写真②

H26,12月時点：下り線の主桁架設状況、1月度予定：下り線残り3径間分の架設作業

上り線

