




京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(V工区)高架橋上部工事
 工期 平成25年7月11日～平成27年10月9日
 施工会社 宮地・三菱特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるV工区高架橋上部工において、IVP6～VP6間の橋梁上部工 上・下線2連を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図

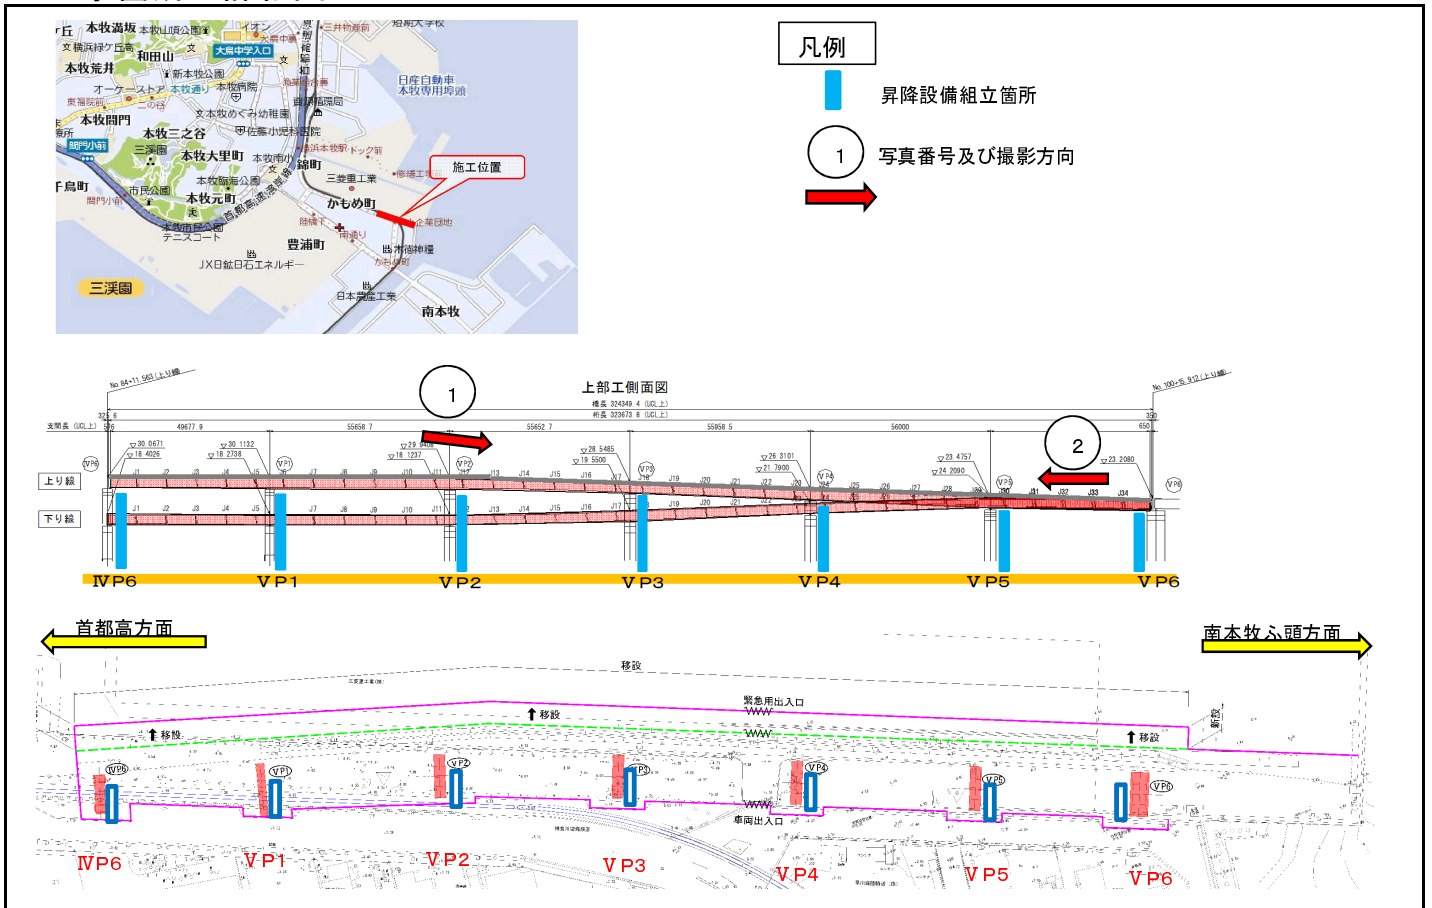

●今月の工事予定

内容	平成27年3月						備考
	5	10	15	20	25	30	
上り線 壁高欄工	■	■	■	■	■	■	
上り線 添接部塗装工	■	■	■	■	■	■	
上り線 現場溶接工	■	■	■	■	■	■	
下り線 床版工				■	■	■	
下り線 添接部塗装工				■	■	■	

●お知らせ

平成26年6月から高架橋上部工事の架設作業を進めてまいりましたが、平成27年2月で架設作業をほぼ終了しました。平成27年3月度は上り線の床版壁高欄等のコンクリート工事を進めています。また、下り線においては、床版部分の鉄筋組立作業を予定しています。3月末頃までに上り線の工事がほぼ完了し、4月頃より足場の解体作業に移る予定です。下り線の工事は6月末頃までの予定です。その後、工期末頃まで下回りの工事を予定しています。近隣の皆様にはご不便をお掛けしますが、本事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

写真① 今月の作業内容

写真①

H27,3月時点: 上り線の床版コンクリート打設完了、壁高欄型枠コンクリート施工中



写真②

H27,3月時点: 下り線の主桁及び合成床版架設完了後全景

