

●鹿島港ケーソン3函目据付完了(4, 000m到達)

工 事 名 : 鹿島港外港地区南防波堤築造工事
工 期 : 平成26年4月17日～平成27年3月17日
施 工 場 所 : 鹿島港南防波堤
請 負 者 : 五洋建設株式会社

当初、8月下旬に予定していた3函目(232号函)のケーソン据付について、気象・海象条件が据付条件に合わずタイミングを見計らっていたところですが、9月19日(金)に無事、据付が完了しました。

翌20日に中詰材投入、21日には蓋コン打設が完了しました。

なお、232号函の据付により、南防波堤が4, 000mに到達しました。

また、4函目の据付は10月下旬を予定しています。



②ケーソン据付状況




③ケーソン据付完了



①ケーソン曳航状況



④中詰材投入状況

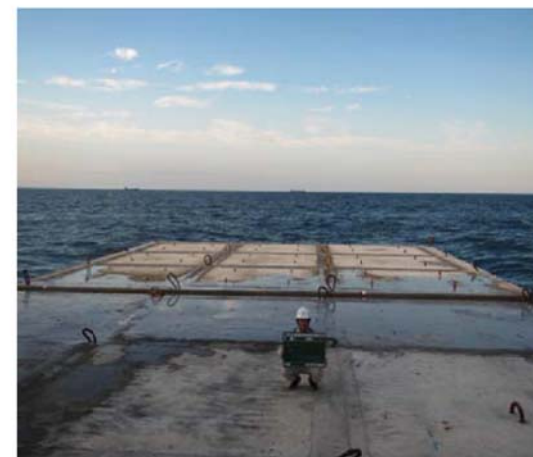

⑤蓋コン打設状況
