




京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線仮設栈橋・栈台築造他工事（その2）
 工 期 平成24年3月22日～平成24年11月30日
 施工会社 東亜・あおみ特定建設工事共同企業体
 工事内容 横浜臨港道路の橋梁下部施工に先立ち、橋脚基礎部の地盤改良工及び作業足場となる仮設栈橋・栈台（作業用通路・ヤード）を施工する工事です。

●工事箇所の詳細図

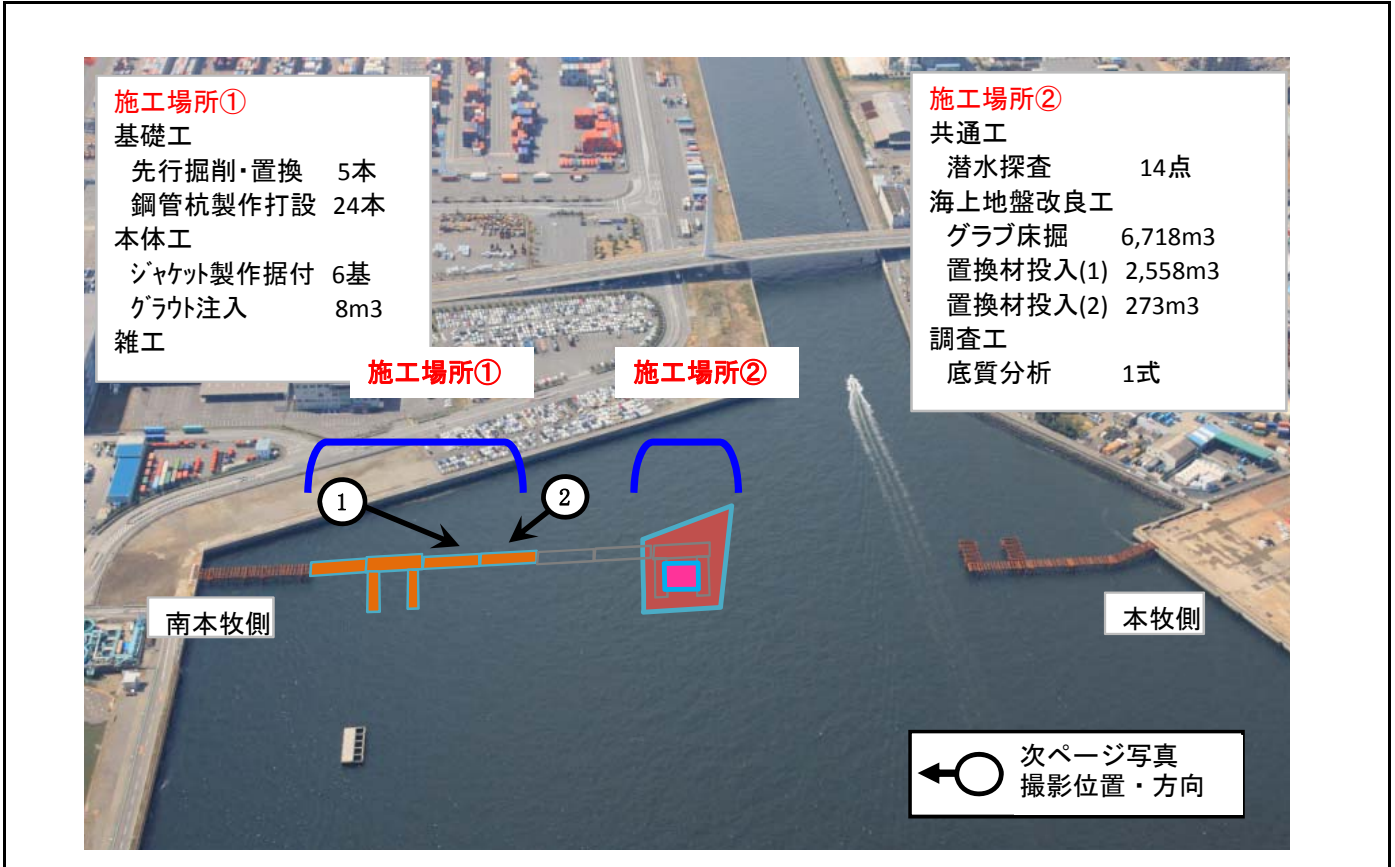

●今月の工事予定


内容	平成24年12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
工事は11月30日を以て、無事故無災害にて完了しました。							

●お知らせ


写真 10月の作業内容

10月は9月に打設した鋼管杭に鋼製ジャケットを据付ける作業と、据付けた鋼製ジャケットを鋼管杭と固定する為の現場鋼材溶接作業を行いました。

①ジャケット据付状況

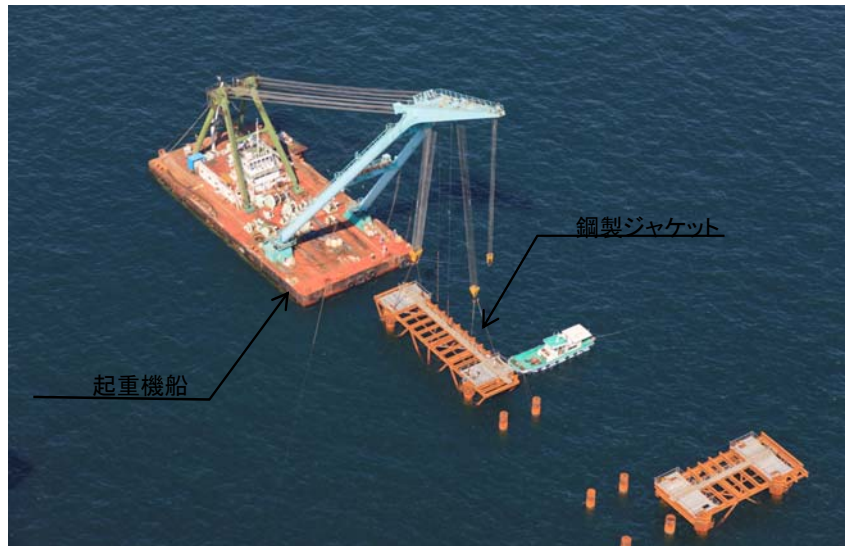

全体施工フロー図

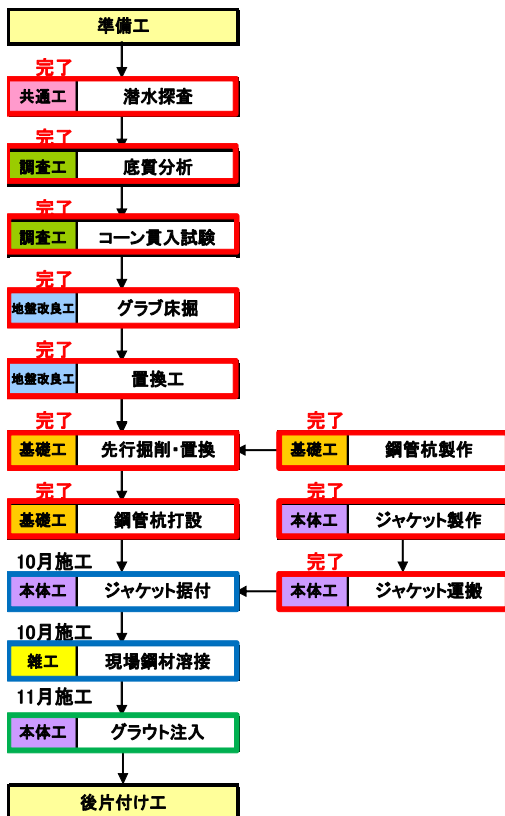


②ジャケット据付完了



写真 11月の作業内容

11月は鋼製ジャケットと鋼管杭の空隙を埋める為のグラウト注入作業を行いました。
 作業は、クレーン付台船及び台船を使用し、台船上のバッチャープラントにてグラウトを練り上げ、潜水士によりジャケット水中部の注入口に注入ホースを取付けて、施工しました。

①グラウト注入状況

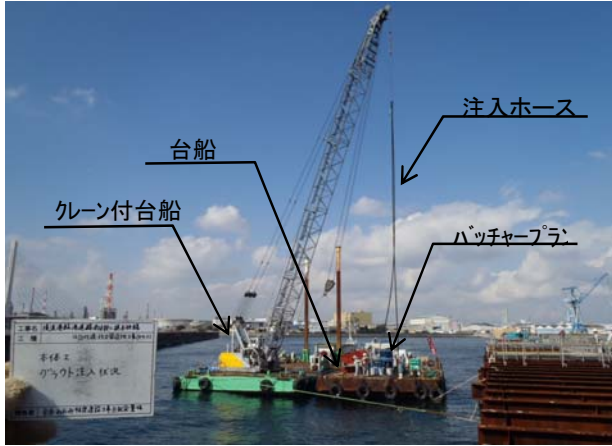

グラウト混練状況



全体施工フロー図



注入ホース接続状況(水中部)

