



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(Ⅲ-2工区)高架橋上部工事
 工 期 平成26年7月14日～平成28年7月4日
 施工会社 宮地・MMB特定建設工事共同企業体
 工事内容 4径間連続鋼床版箱桁(上り線・下り線)の工場製作、架設、現場溶接、現場塗装、壁高欄ほか


交通規制を伴った夜間での桁架設および足場組立作業は完了しました。

現在架設現場では、桁の位置や高さの調整を行い、桁調整終了後に現場溶接作業とボルト締付作業を行っています。

施工位置図



桁位置調整後の測量



ボルト締付



鋼床版溶接



| 内容 | 平成27年12月 | | | | | | 備考 |
|---------------|----------|----|----|----|----|----|------|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| (工場製作) | | | | | | | |
| 橋梁付属物製作工 | | | | | | | 昼間作業 |
| (現場) | | | | | | | |
| 現場継手工(現場溶接) | | | | | | | 昼間作業 |
| 現場継手工(本締めボルト) | | | | | | | 昼間作業 |
| | | | | | | | |

●お知らせ

夜間での桁架設作業は先月で終了し、現在ボルトの締付作業と鋼床版の現場溶接を行っています。

来月からベント設備解体作業を日曜日を除く夜間22:30～6:00に市道52号線を通行止めもしくは車線規制を行い作業をする予定です。

近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。


写真① 今月の作業内容

写真① 鋼床版溶接作業状況



橋面上で桁部材を溶接でつなぎ合わせる作業を行っています。

写真② 架設現場全景

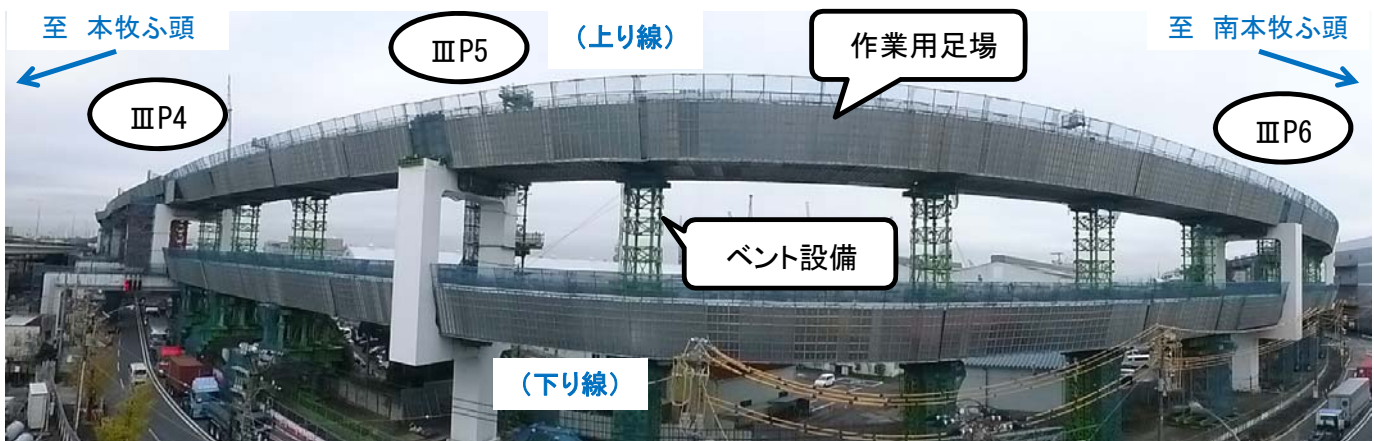

先月桁架設作業が終了し、現在ボルトの締付作業と鋼床版の現場溶接を行っています。
来月から、桁を仮支えているベント設備(緑色の部材)を夜間作業にて解体する予定です。
