



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（VI工区）橋梁上部工事
 工 期 平成25年10月23日～平成28年3月15日
 施工会社 川田工業・日立造船特定建設工事共同企業体
 工事内容 横浜港臨港道路の整備事業として、3ブロックに分割した鋼3径間連続鋼床版箱桁橋を、大型起重機船による大ブロック一括架設工法で構築する工事です。

●工事箇所の詳細図



●今月の工事予定

内容	平成27年12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
鋼橋架設工							
壁高欄工	[Progress bar]						
足場工	[Progress bar]						大ブロック継手足場撤去・復旧
橋体架設工	[Progress bar]						仮設備撤去


●お知らせ

工場製作された鋼桁を3ブロックに分割した鋼3径間連続鋼床版箱桁橋の大ブロック架設を10月4日に完了しました。その後、大ブロックの継手部の施工も完了し、12月13日に継手部の足場を一括撤去しました。現在、壁高欄を施工中です。

写真① 今月の作業内容

写真① 橋梁足場工：大ブロック継手足場撤去

大ブロック継手部の施工が完了し、作業用の足場として使用していた、大ブロック継手足場を一括撤去しました。

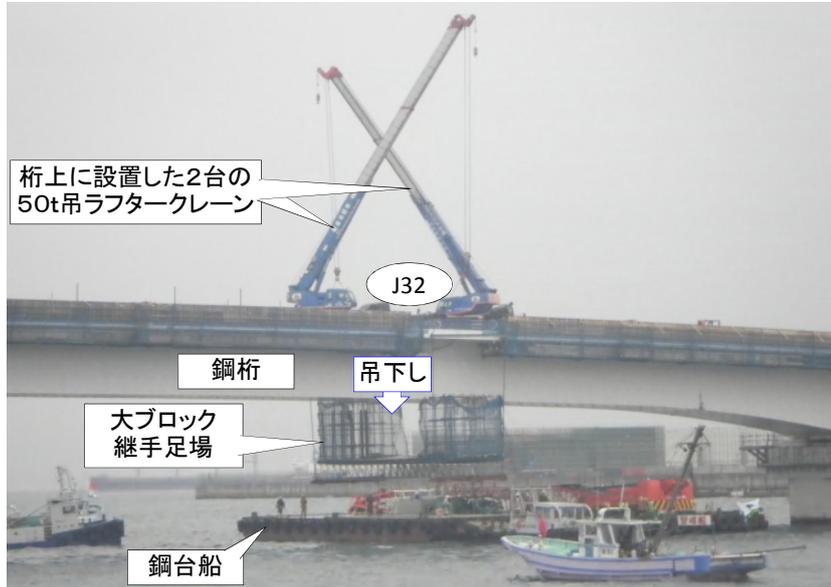

写真② 壁高欄工：コンクリート打設

鋼桁上の壁高欄の鉄筋・型枠を組立、コンクリートを打設しました。



今後、壁高欄のコンクリート打設を繰り返し、平成27年1月中旬にコンクリート打設完了予定です。
