




京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(Ⅲ-2工区)高架橋上部工事
 工 期 平成26年7月14日～平成28年9月9日
 施工会社 宮地・MMB特定建設工事共同企業体
 工事内容 4径間連続鋼床版箱桁(上り線・下り線)の工場製作、架設、現場溶接、現場塗装、壁高欄ほか

現在架設現場では、上り線および下り線で現場溶接およびボルトの締付が終わった継手の塗装作業を行っています。橋桁上では壁高欄コンクリートの打設作業を行っています。ⅢP4のヤードで橋桁上から地上に避難するための階段の組立作業を行っています。また、夜間作業にてⅢP7-ⅢP8間のベント(橋桁を仮に受ける部材)解体作業を行っています。

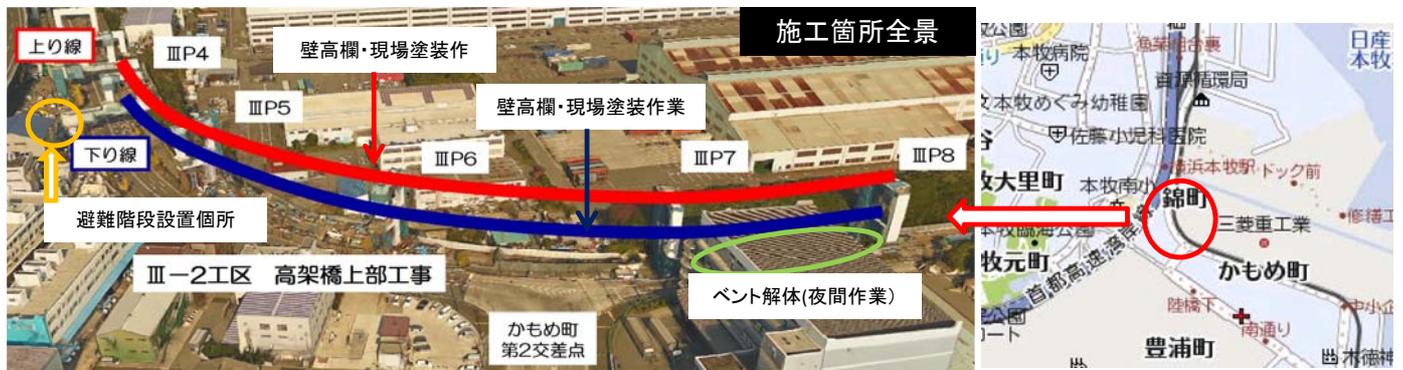

内容	平成28年3月						備考
	5	10	15	20	25	30	
(現場)							
現場塗装(塗装)							昼間作業
現場塗装(溶射)							昼間作業
支承工(溶接)							昼間作業
壁高欄工							昼間作業
ベント解体							夜間作業
避難階段設置							夜間作業

●お知らせ

ベント設備解体作業および避難階段の設置作業を日曜日を除く夜間22:30～6:00に市道52号線を通行止めもしくは車線規制を行い作業をする予定です。

近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

写真① 今月の作業内容

写真① 避難階段組立状況



緊急時に橋桁上から地上に移動するための階段の設置作業をしています。市道52号線上に設置する階段については、夜間作業にて設置をします。

写真② 架設現場全景



日中は、作業用足場の中で壁高欄コンクリートの打設と現場継手部の塗装作業を行っています。桁を仮支えていたバント設備は全29基のうち26基の解体が完了しています。残りの3基を夜間作業にて解体する予定です。
