




京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(Ⅲ-2工区)高架橋上部工事
 工 期 平成26年7月14日～平成28年9月9日
 施工会社 宮地・MMB特定建設工事共同企業体
 工事内容 4径間連続鋼床版箱桁(上り線・下り線)の工場製作、架設、現場溶接、現場塗装、壁高欄、構造物復旧工、仮設工、附帯工 他

現在架設現場では、ⅢP8橋脚周りの伸縮装置後打ちコンクリートおよび壁高欄コンクリートの施工を行っています。橋面上では、架設の終わった橋桁の出来形計測を行っています。また、地上にて官民用地境界のコンクリート塀復旧工事の準備作業(測量および現地踏査)を行っています。

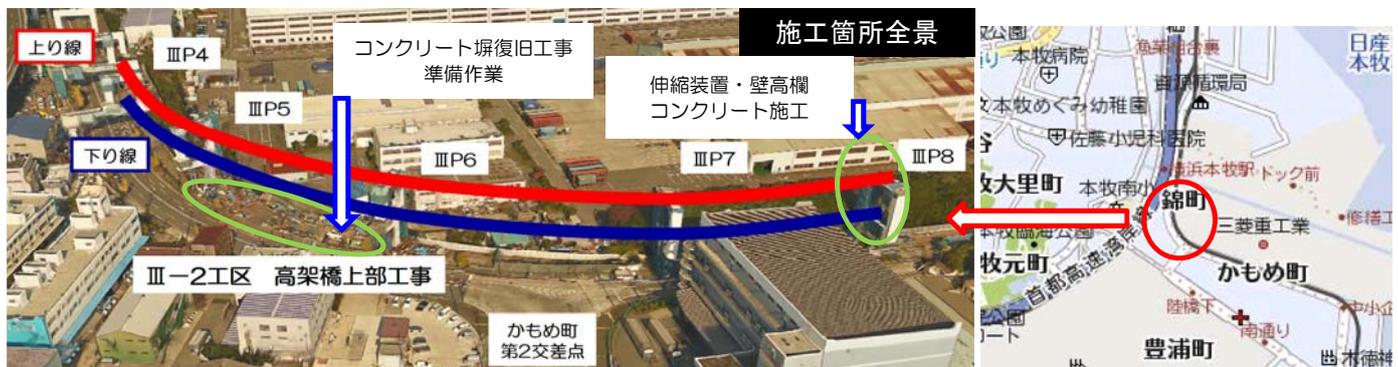


内容	平成28年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
(現場)							
現場塗装(補修仕上げ)	[Blue bar from 5 to 30]						昼間作業
付属物(伸縮装置)		[Blue bar from 10 to 15]					昼間作業
付属物(壁高欄)			[Blue bar from 15 to 20]				昼間作業
足場解体					[Blue bar from 20 to 25]		夜間作業
場内機材返却片付け	[Blue bar from 5 to 30]						昼間作業
復旧工事準備作業	[Blue bar from 5 to 30]						昼間作業

●お知らせ

6月23日～6月25日の3日間、かもめ町第2交差点からⅢP8橋脚までの市道52号線を通行止めにして夜間作業を行いました。ご協力ありがとうございました。橋梁の架設工事はほぼ完了しました。
 来月からは昼間施工で官民用地境界の構造物復旧工事を行います。工事車両の出入りなどで近隣の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、工事へのご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

写真① 今月の作業内容

写真① 架設現場全景<その1>

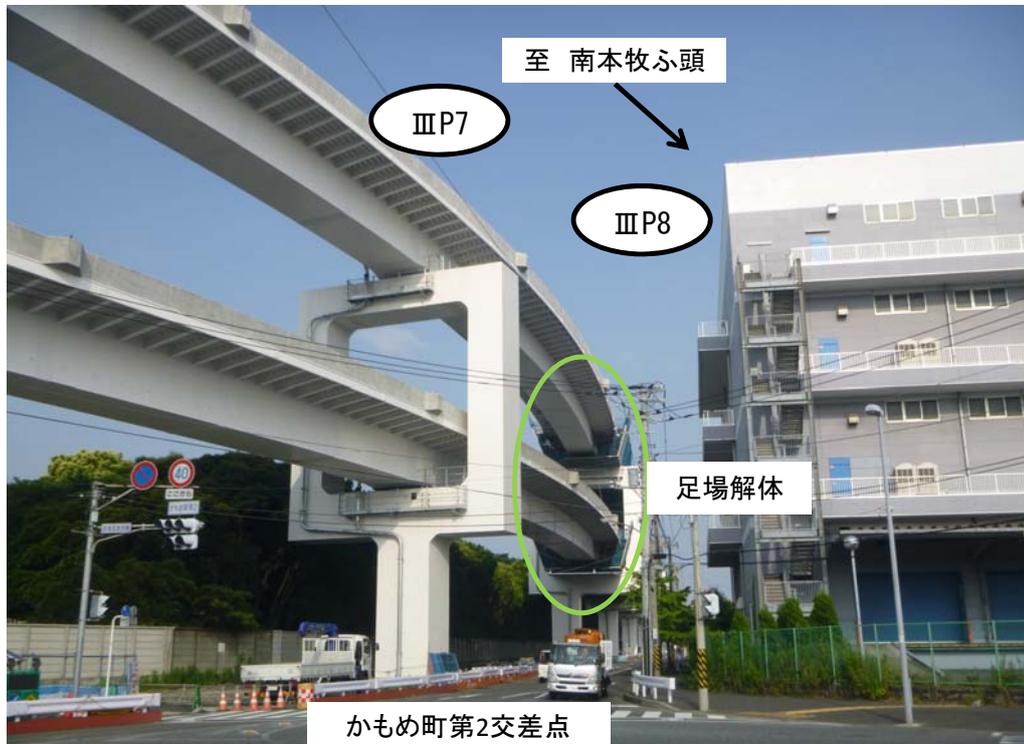

ⅢP8橋脚付近に残っている足場の解体作業を6月23日～25日の夜間に実施し無事作業を完了しました。
ご協力ありがとうございました。

写真② 架設現場全景<その2>



ⅢP4～ⅢP7については、足場解体まですべて完了している状態です。
今後は、地上での構造物復旧工事を行っていきます。
