




京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(V工区)高架橋上部工事
 工期 平成25年7月11日～平成27年10月9日
 施工会社 宮地・三菱特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるV工区高架橋上部工において、IVP6～VP6間の橋梁上部工 上・下線2連を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図

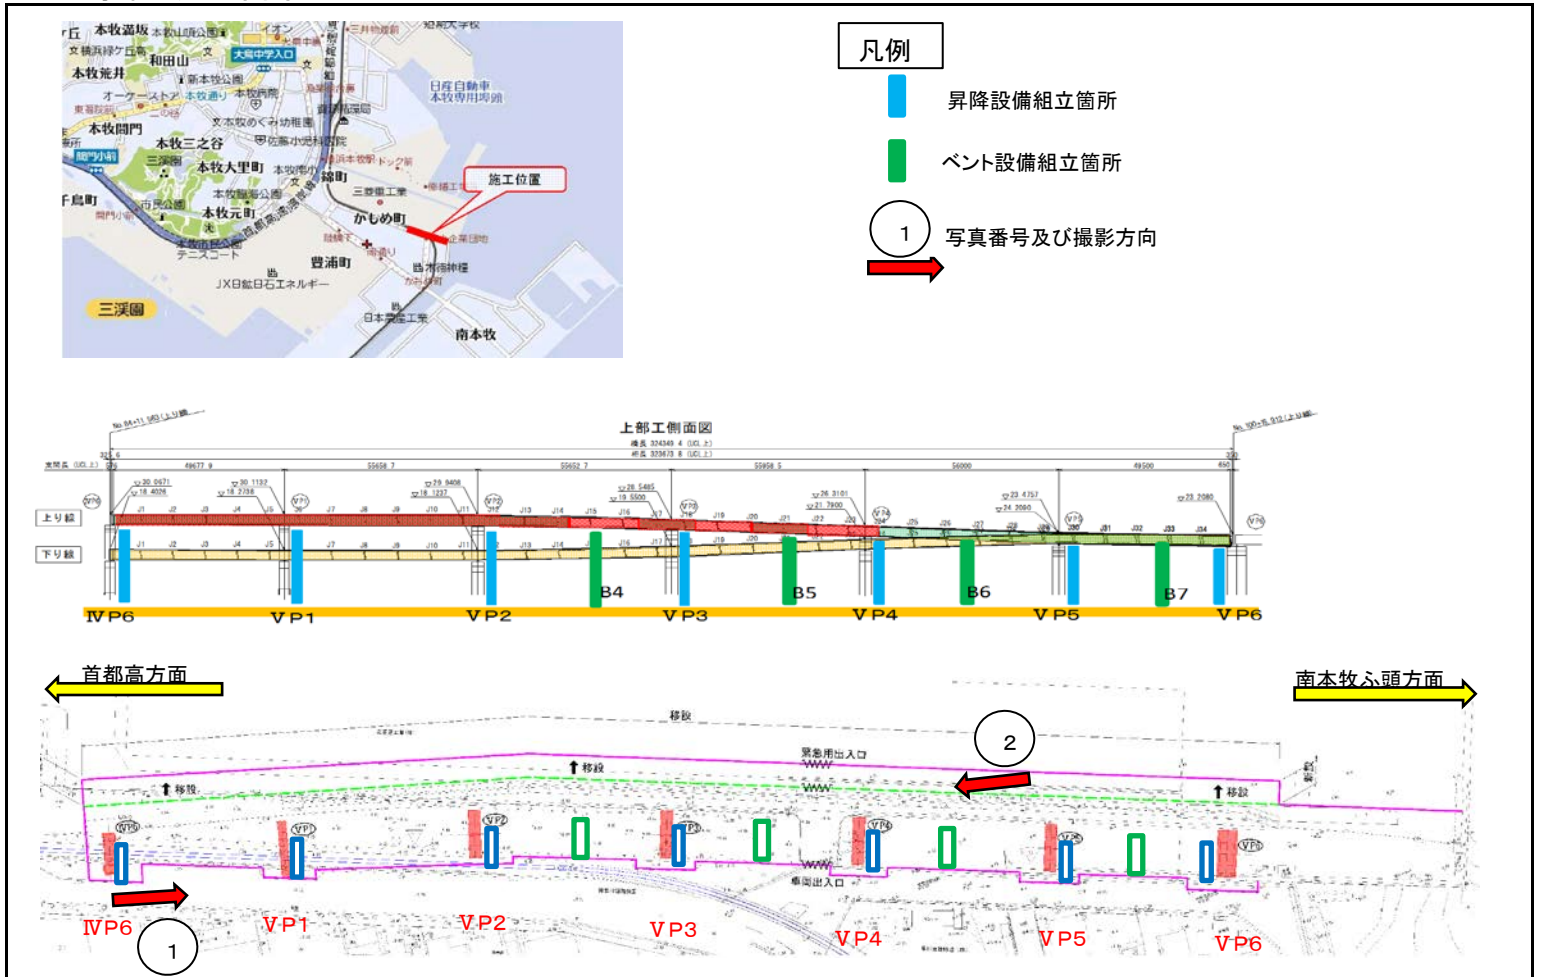

●今月の工事予定

内容	平成26年10月						備考
	5	10	15	20	25	30	
上り線 架設工							VP4～VP6の架設作業
上り線 本締め工							
上り線 ベント解体工							B4～B7
上り線 足場工							ベント部の足場組立
下り線 ベント組立工							

●お知らせ

平成26年6月から高架橋上部工事の架設作業を進めています。
 10月度は上り線の架設作業がVP6まで完了予定です。
 中旬頃までに主桁の架設を終え、ボルト本締め後ベント解体、ベント部の足場組立を行い、11月より合成床版の架設に入る予定です。また、10月末頃より下り線のベント組立作業に入る予定です。上り線の床版工事は12月頃から開始の予定です。
 近隣の皆様にはご不便をお掛けしますが、本事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

写真 今月の作業内容

写真①

9月度：上り線VP2～VP4間の架設作業、10月度予定：上り線VP4～VP6間の架設作業他



写真②

9月度：上り線VP2～VP4間の架設作業、10月度予定：上り線VP4～VP6間の架設作業他

