




京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(V工区)高架橋上部工事
 工期 平成25年7月11日～平成27年10月9日
 施工会社 宮地・三菱特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるV工区高架橋上部工において、IVP6～VP6間の橋梁上部工 上・下線2連を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図

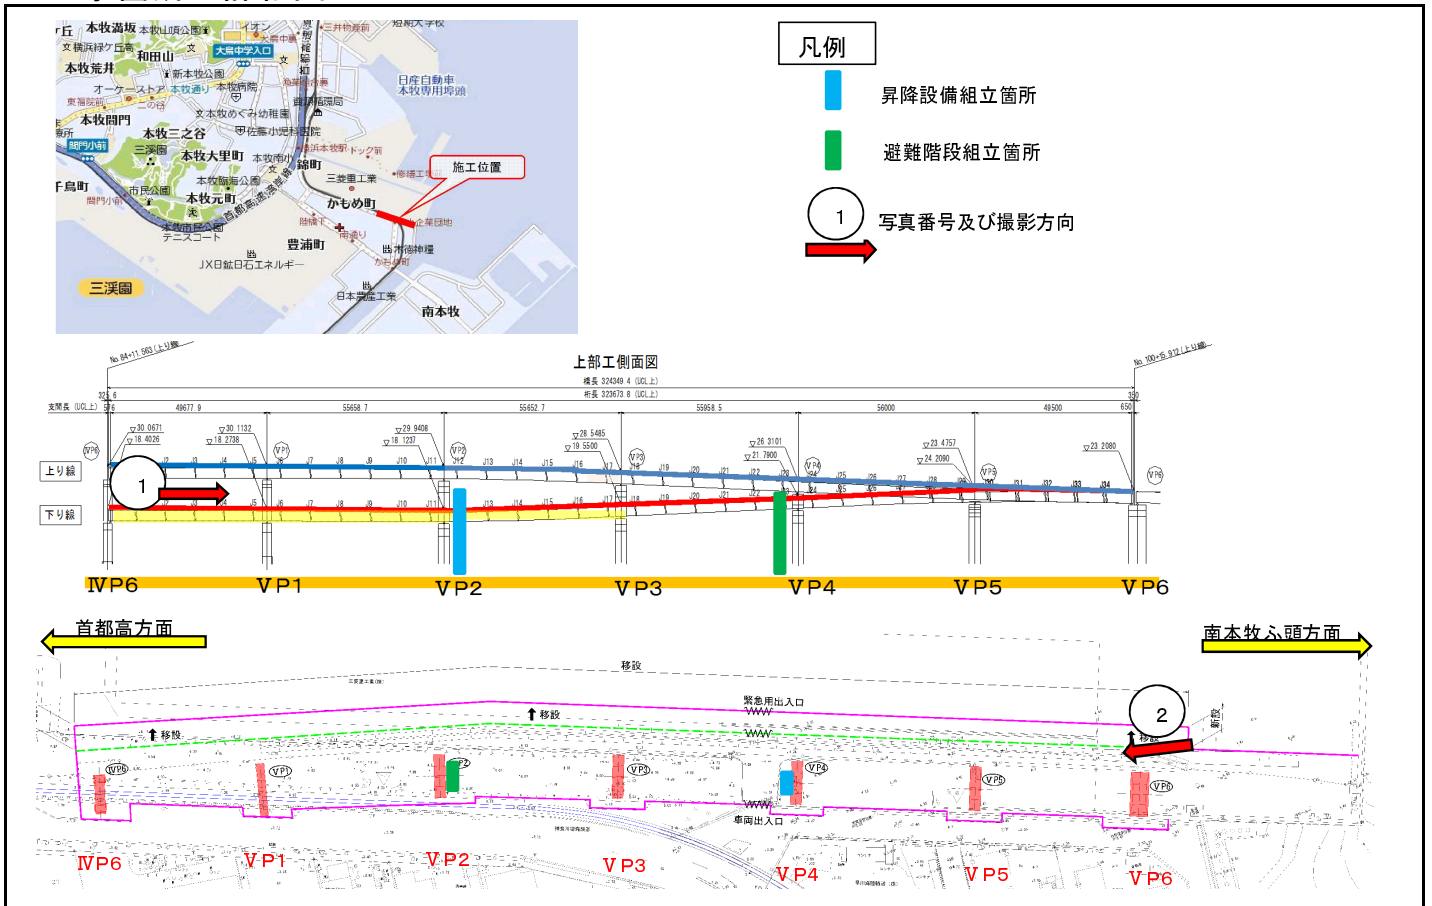

●今月の工事予定

内容	平成27年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
下り線 壁高欄工	[Progress bar from 5 to 30]						
下り線 添接部塗装工	[Progress bar from 5 to 20]						
下り線 足場工	[Progress bar from 20 to 30]						
避難階段土間工	[Progress bar from 20 to 30]						
避難階段架設工	[Progress bar from 20 to 30]						

●お知らせ

平成26年6月から高架橋上部工事の架設作業を進めてまいりましたが、今月で橋梁部分はほぼ完成となります。平成27年6月度は下り線の壁高欄の型枠脱枠、仕上げ作業及び下り線添接部の塗装作業が完了し、その後吊り足場の解体作業に移ります。来月から入場口のP4橋脚に施工される避難階段の架設作業を予定しています。また、ヤード内の土工事を工期末頃まで予定しています。近隣の皆様にはご不便をお掛けしますが、本事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

写真① 今月の作業内容

写真①

H27,6月時点: 下り線の壁高欄コンクリート打設完了、仕上げ作業中



写真②

H27,6月時点: 下り線の全景(吊り足場解体作業前)

