



京浜港湾事務所

工事名 横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)築造工事
 工期 平成29年10月30日 ~ 平成31年 3月29日
 施工会社 東亜・みらい・りんかい日産特定建設工事共同企業体
 工事内容 既設岸壁(水深7.5m)を撤去し、鋼管矢板打設、地盤改良等を行い、岸壁(水深12m)を改良・築造します。

●本工事の施工記録



既設棧橋 撤去
平成30年 2月



鋼管矢板打設
平成30年 4月



頂部コンクリート打設
平成30年 8月



地盤改良工 削孔
平成30年11月

●進捗状況


薬液注入、裏理工、舗装工(小口止コンクリート)が終わり、2月中旬より舗装工の路盤の施工、舗装コンクリートの施工を行っています。
 3月も引き続き舗装コンクリートの施工及び、工事完成に向けた片付けを行います。

●お知らせ

横浜市へ作業ヤードの引渡しを随時行っています。



横浜港大黒ふ頭地区再編改良事業



年度	H28	H29	H30	H31	H32
岸壁(水深12m)(改良)					
航路・泊地(水深12m)			本工事		
泊地(水深12m)					
ふ頭用地 (事業区分:起債)					



横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)築造工事


1月～2月の進捗状況



1月下旬



2月下旬

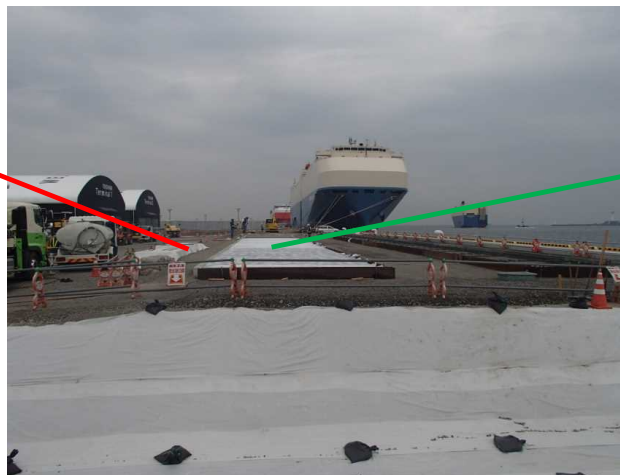

裏埋
2月末で完了

舗装コンクリート
3月現在施工中

3月の工程

内容	平成31年3月						備考
	5	10	15	20	25	31	
舗装工	[Blue bar from 5 to 20]						
仮設工	[Blue bar from 5 to 31]						

29日
工期完了
