




京浜港湾事務所

工 事 名：横浜港南本牧地区護岸(防波)裏込等工事
 工 期：平成22年6月18日～平成23年3月18日
 施工会社：若築・りんかい日産特定建設工事共同企業体
 工事内容：横浜港南本牧地区の防波護岸を建設する工事
 です。



●工事箇所の詳細図

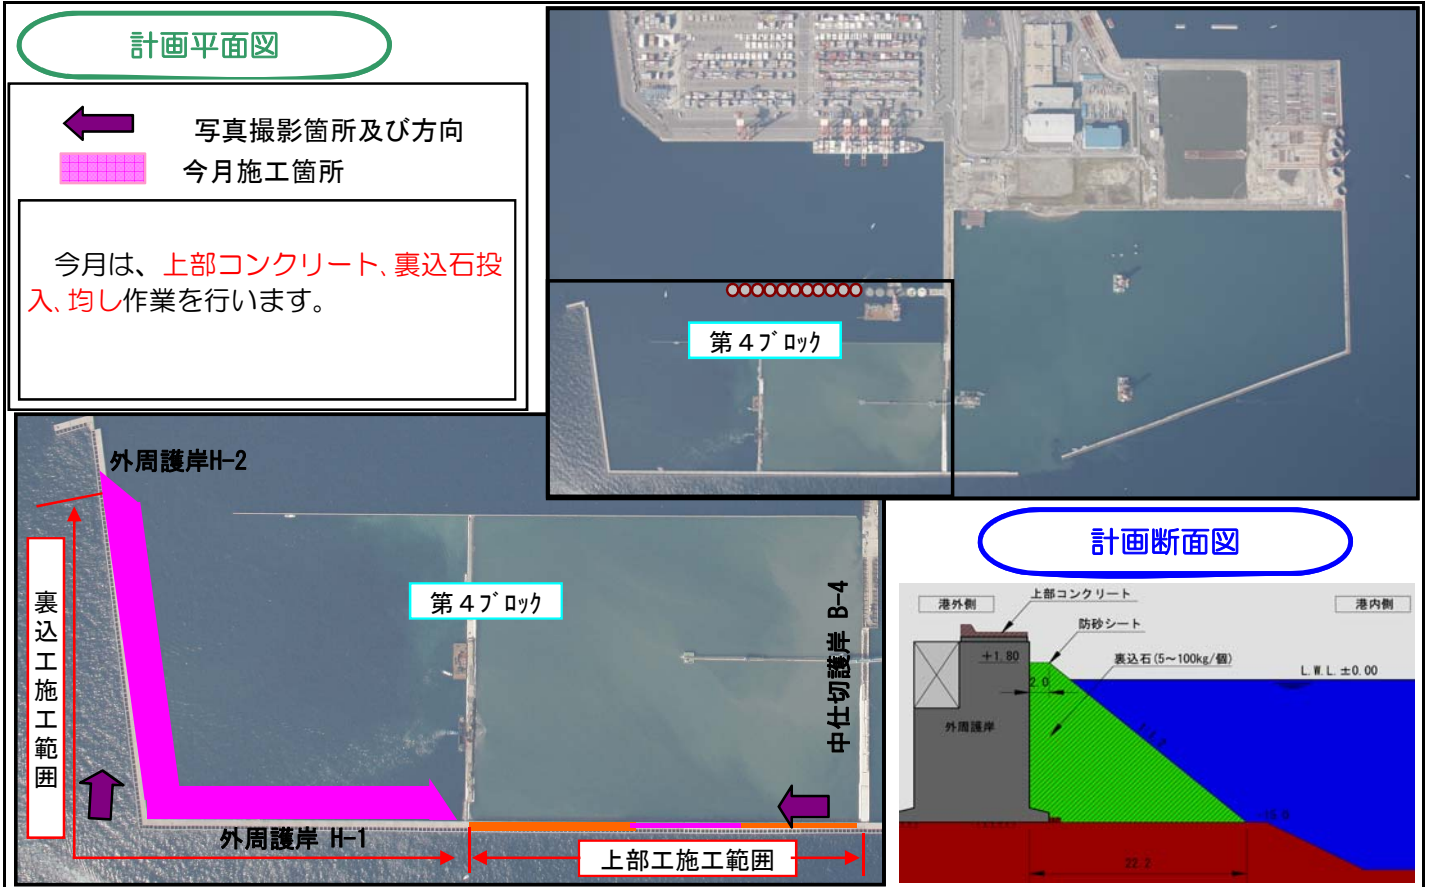

●今月の工事予定

| 内容 | 平成22年10月 | | | | | | 備考 |
|---------------|------------|----|----|------------|----|----|----|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | |
| 上部工 上部コンクリート | [Cyan bar] | | | | | | |
| 裏込工 裏込石投入 | [Cyan bar] | | | | | | |
| 裏込工 裏込均し±20cm | | | | [Blue bar] | | | |

■ 昼間作業 (7:00~17:00)
 ■ 夜間作業 (19:00~7:00)

●お知らせ

作業時間は、月～土曜日 昼間:7時から17時、夜間:19時～翌7:00となります。
 週2～3回のコンクリートの打設日は、アジテータ車が最大で延べ30～40台走行します。
 近隣の皆様には、大変ご不便をお掛けしますが、工事の御理解、御協力のほど、宜しくお願い致します。

写真① 今月の作業内容



■ 4ブロック

今月で9月上旬から開始した裏込石の投入作業が完了する予定です。(施工延長約800m)

また、裏込石の投入作業が完了した箇所から順次裏込均し作業を開始します。

裏込均し作業は、1個の石の重さが5~100kgの石を設計値±20cmの高さで仕上げます。

開口部付近の機械均しは、他の工事船舶の4ブロック

写真②



■ 4ブロック

今月で9月上旬から開始した上部コンクリートの施工が約60%が完了する予定です。(施工延長約500m)

天候にも左右されますが、年内に上部コンクリートの施工完了を目指します。
