


京浜港湾事務所




工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP5・6) 橋梁下部工事
 工期 平成27年3月19日～平成30年3月30日
 施工会社 清水・五洋特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事では、2本の基礎・橋脚の構築があります。各々14ロットに分けて構築しますが、現在2本とも5ロットまで構築を終了し、6ロット目の構築に向けて作業中です。

●工事箇所の詳細図

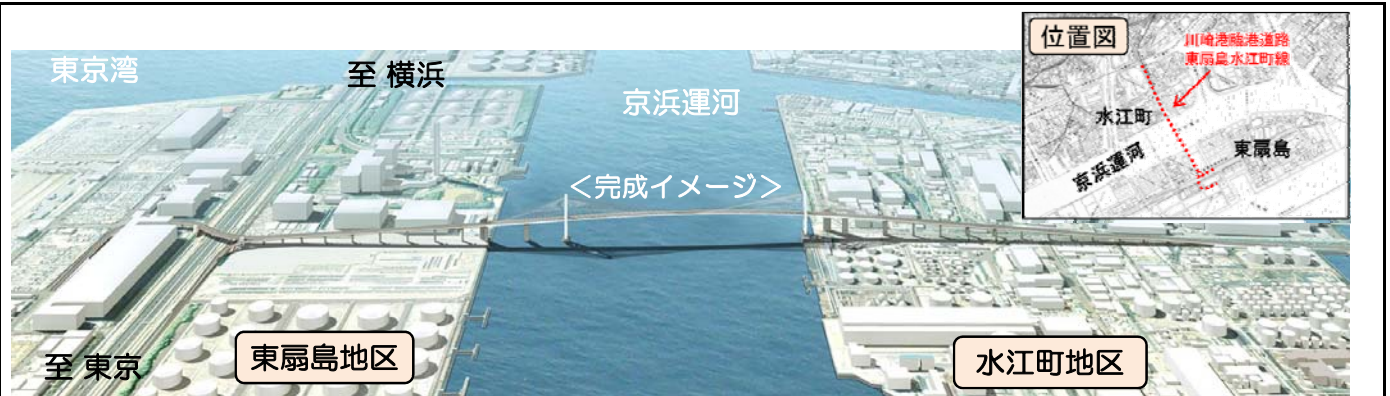

施工箇所平面図

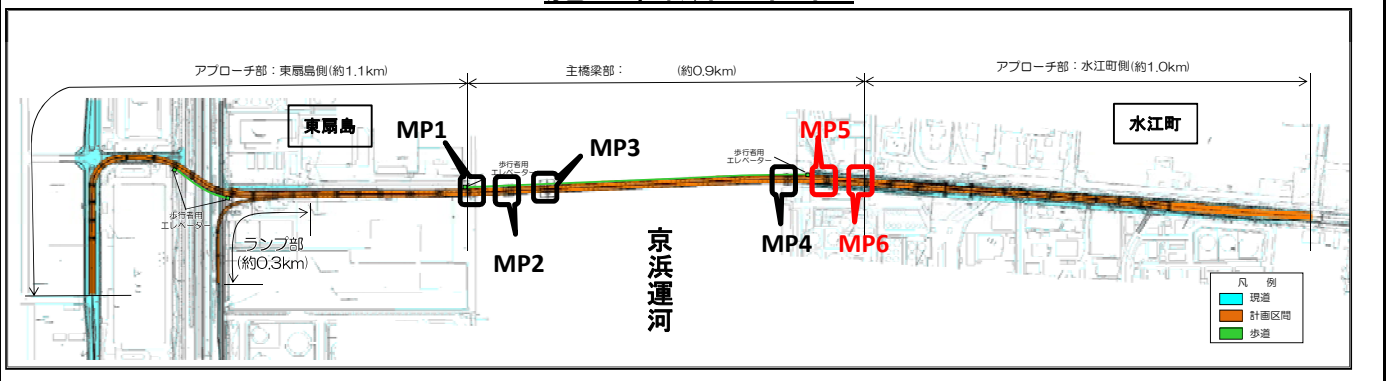

●6月の工事予定

内容	平成29年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
MP5橋脚基礎工							
鉄筋組立	■						
型枠の設置・脱型		■					
コンクリート打設					■		9月26日
沈下掘削	■		■				夜間作業
MP6橋脚基礎工							
鉄筋組立	■					■	
型枠の設置・脱型	■	■			■		
コンクリート打設				■			9月19日
沈下掘削	■					■	夜間作業

●お知らせ

作業時間は、原則として昼間は8時から17時、沈下掘削は夜間17時から5時まで。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 7~8月の作業内容

写真①



MP5コンクリート
型枠組立です。

写真②



MP5・6全景
手前がMP5、奥
がMP6です。
