

京浜港湾事務所




工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP5・6)橋梁下部工事
工期 平成27年3月19日～平成30年3月30日
施工会社 清水・五洋特定建設工事共同企業体
工事内容 本工事では、2本の基礎・橋脚の構築があります。各々14ロットに分けて構築しますが、現在MP5が9ロットまで、MP6が10ロットまで構築を終了しています。夜間に橋脚の下を掘削して沈設を行っています。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図

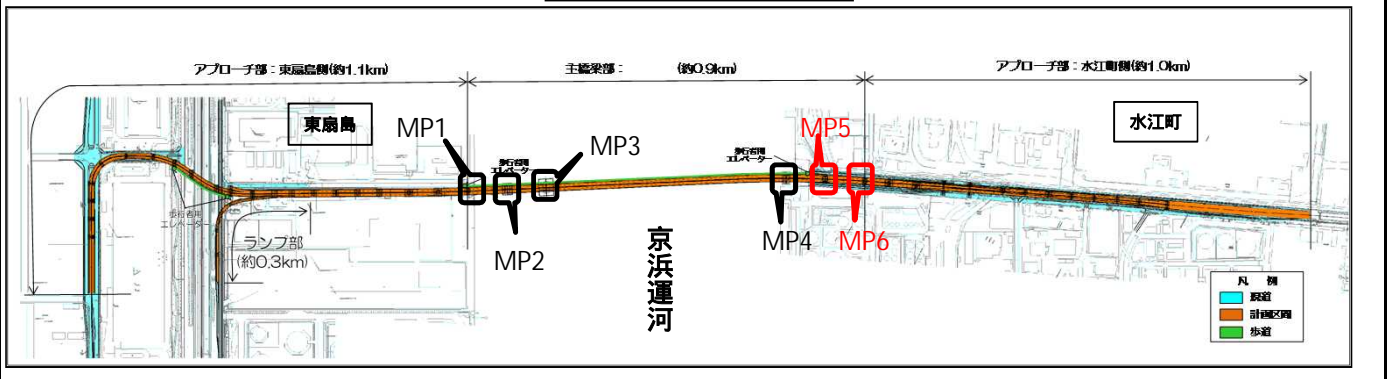

3月の工事予定

内容	平成30年3月						備考
	5	10	15	20	25	31	
MP5橋脚基礎工							
鉄筋組立	[Blue bar from 5 to 20]						
型枠の設置・脱型	[Blue bar from 20 to 31]						
コンクリート打設	[Blue bar from 20 to 31]						
沈下掘削	[Blue bar from 5 to 15]						夜間作業
MP6橋脚基礎工							
鉄筋組立	[Blue bar from 5 to 15]						
型枠の設置・脱型	[Blue bar from 15 to 25]						
コンクリート打設	[Blue bar from 15 to 25]						3月22日打設
沈下掘削	[Blue bar from 5 to 15]						夜間作業

お知らせ

作業時間は、原則として昼間は8時から17時、沈下掘削は夜間17時から5時まで。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 1～2月の作業内容

写真



MP6 橋脚基礎
型枠取外しを行っ
ている状況です。

写真



MP5・6 全景
手前がMP5、奥
がMP6です。
