

京浜港湾事務所




工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP5・6)橋梁下部工事  
 工期 平成30年4月1日～平成31年4月30日  
 施工会社 清水・五洋特定建設工事共同企業体  
 工事内容 本工事では、2本の基礎・橋脚の構築があります。各々14ロットに分けて構築しますが、現在MP5が11ロットまで、MP6が12ロットまで構築を終了しています。夜間に橋脚の下を掘削して沈設を行っています。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図

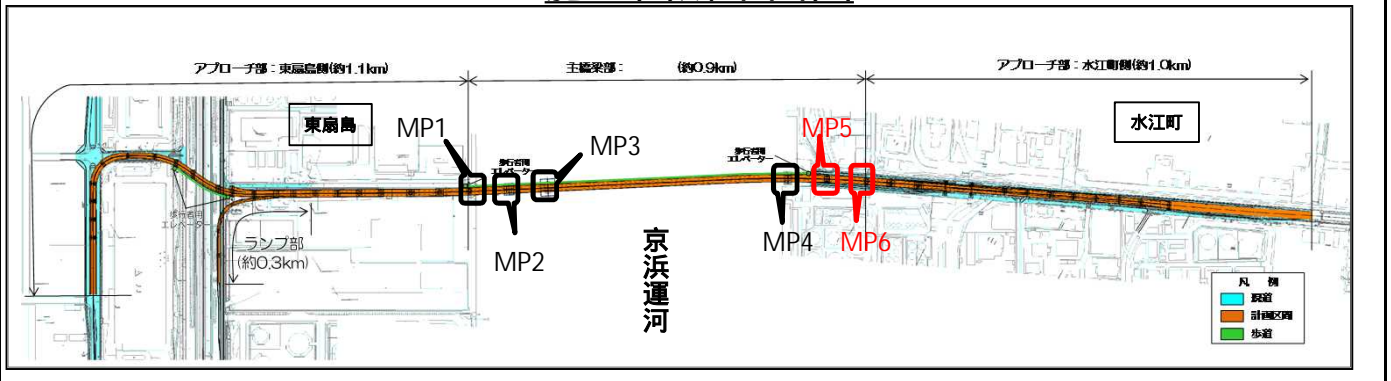

6月の工事予定

| 内容       | 平成30年6月 |    |    |    |    |    | 備考      |
|----------|---------|----|----|----|----|----|---------|
|          | 5       | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |         |
| MP5橋脚基礎工 |         |    |    |    |    |    |         |
| 鉄筋組立     | ■       |    |    |    |    |    |         |
| 型枠の設置・脱型 |         |    | ■  |    |    |    |         |
| コンクリート打設 |         |    |    |    |    | ■  | 6月29日打設 |
| 沈下掘削     | ■       |    |    |    |    |    | 夜間作業    |
| MP6橋脚基礎工 |         |    |    |    |    |    |         |
| 鉄筋組立     | ■       |    |    |    |    |    |         |
| 型枠の設置・脱型 | ■       |    |    |    |    |    |         |
| コンクリート打設 |         |    | ■  |    |    |    | 6月13日打設 |
| 沈下掘削     |         |    |    |    | ■  |    | 夜間作業    |

お知らせ

作業時間は、原則として昼間は8時から17時、沈下掘削は夜間17時から5時まで。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 4～5月の作業内容

写真



MP5橋脚基礎  
コンクリートを打ち込  
んでいる状況  
です。

写真



MP5・6全景  
手前がMP5、奥が  
MP6です。
