

京浜港湾事務所



工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP3)橋梁下部工事
 工期 平成30年4月1日 ~ 平成32年1月31日
 施工会社 東亜・若築・みらい特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の主塔の基礎となるMP3の下部工を構築するため、鋼管矢板井筒工法により、基礎構築及び橋脚構築を行います。

●本工事の施工記録



井筒内 排水
平成30年 5月



スタッド鉄筋 鋼管矢板に溶接
平成30年 8月



中詰コンクリート 打設
平成30年10月

●進捗状況

頂版コンクリートの施工(次頁参照)が終わり、3月は足場組立作業および橋脚構築作業を行います。

●お知らせ

3月~9月頃にかけて1~2回/月の頻度でコンクリートの打設を予定しています。
 打設日は、最大370台の生コン車が7時~21時の時間帯に通行します。




川崎港東扇島~水江町地区 臨港道路整備事業



年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
測量・調査・設計(施工検討含む)															
用地取得調整・工作物移設															
関係者調整等(近接施工・上部工施工)															
施工															

本工事

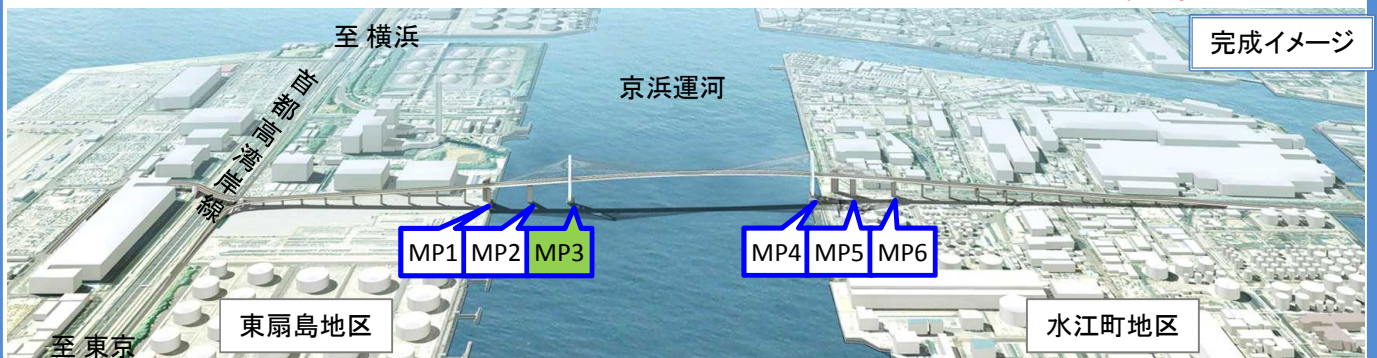

完成イメージ

