



京浜港湾事務所

工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP3) 橋梁下部工事
工期 平成30年4月1日 ～ 令和2年3月30日
施工会社 東亜・若築・みらい特定建設工事共同企業体
工事内容 橋梁の主塔の基礎となるMP3の下部工を構築するため、鋼管矢板井筒工法により、基礎及び橋脚を施工します。

●本工事の施工記録



中詰コンクリート 打設
平成30年10月



頂版コンクリート 打設
平成31年 2月



橋脚鉄筋組立
令和元年 5月



コンクリート型枠組立
令和元年 8月

●進捗状況・お知らせ

【進捗状況】

10月にMP3橋脚は完成しました。今後は鋼管矢板井筒内支保工の撤去作業を行います。

【お知らせ】


12月中旬から2月上旬にかけて鋼台船を使用し、鋼管矢板井筒内支保工の海上運搬作業を行います。鋼台船による運搬頻度は6隻/月程度となる見込みです。



川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業



年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
測量・調査・設計(施工検討含む)															
用地取得調整・工作物移設															
関係者調整等(近接施工・上部工施工)															
施工															■ 本工事

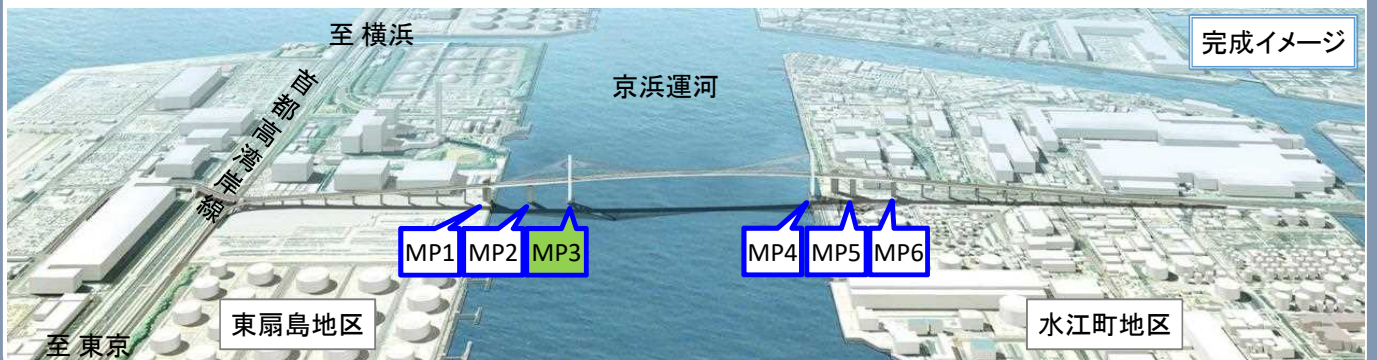

完成イメージ

東扇島地区

水江町地区

川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP3)橋梁下部工事

9月～11月の施工状況

【橋脚鉄筋組立】



<R1.9> 橋脚鉄筋を組み立てています

【コンクリート型枠組立】



<R1.9> コンクリート打設のため、型枠を組み立てています

【橋脚コンクリート打設】



<R1.10> 橋脚構築のため、コンクリートを打設しています

【MP3橋脚完成】



<R1.10> MP3橋脚が完成しました

12月の工程

内容	令和元年12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
基礎・橋脚工							
MP3橋脚構築							
支保工							
井筒内支保撤去	[Progress bar from 5 to 25]						
土工							
井筒内埋戻し							
