



京浜港湾事務所

工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP5, 6) 橋梁下部工事

工期 平成31年4月18日 ～ 令和2年3月23日

施工会社 清水建設株式会社

工事内容 本工事は橋梁下部工2基 (MP5・6) を施工します。

●本工事の施工記録



令和元年9月



令和元年10月



令和元年11月

●進捗状況・お知らせ

現在MP5・6ともに橋脚を構築中です。


今後、年度末にかけて合計約1600m³のコンクリート打設を行います。



川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業



年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
測量・調査・設計(施工検討含む)															
用地取得調整・工作物移設															
関係者調整等(近接施工・上部工施工)															
施工															■ 本工事

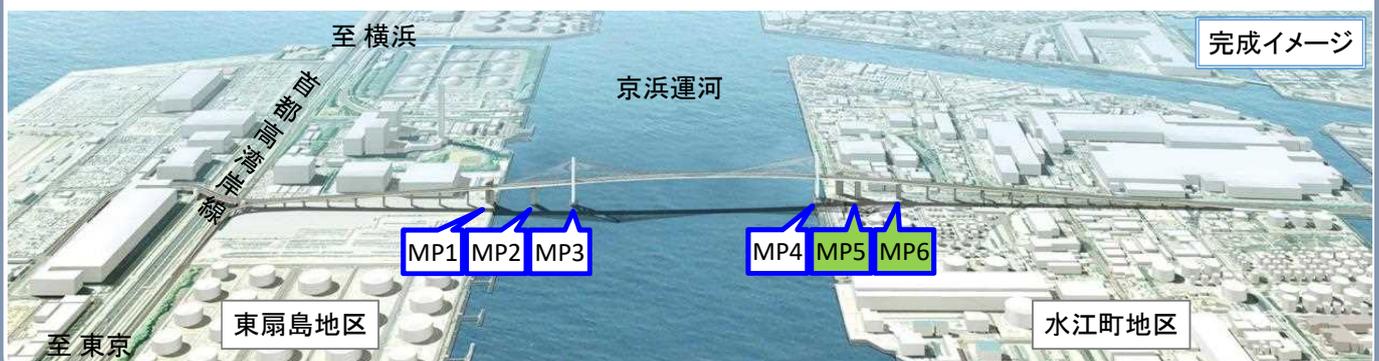

川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP5.6)橋梁下部工事

施工状況

【橋脚基礎廻り鋼矢板引抜き状況】



70tクローラークレーン組立状況




鋼矢板引抜き状況



70tクローラークレーンを使用し、バイプロハンマー工法で鋼矢板の引抜きをしたよ。
引抜いた鋼矢板の長さは**1枚30m**あるよ。

【橋脚部 鉄筋・型枠組立～コンクリート打設】

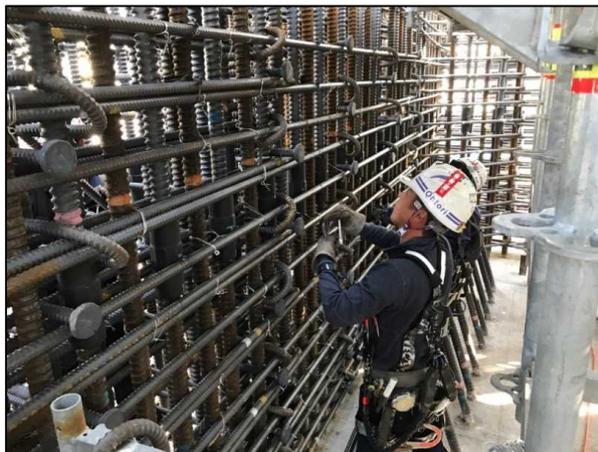

橋脚部 鉄筋組立状況



橋脚部 コンクリート打設状況



11月に橋脚部1ロットを構築したよ。
MP5・6合わせて**約540m³**のコンクリートを打設したよ。
