



京浜港湾事務所

工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP2) 橋梁下部工事

工期 平成31年4月1日 ～ 令和3年2月26日

施工会社 五洋・清水特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事は橋梁下部工のうちの1基 (MP2) の基礎および橋脚を、鋼管矢板井筒工法により施工しています。

●本工事の施工記録



6ㇰ目完了
令和2年9月



7ㇰ目完了
令和2年10月



8ㇰ目完了
令和2年11月



足場解体完了
令和2年12月


●進捗状況・お知らせ

本工事の躯体構築が完了しました。
今後の作業は、鋼管矢板井筒の撤去を行います。



川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業


▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
測量・調査・設計(施工検討含む)															
用地取得調整・工作物移設															
関係者調整等(近接施工・上部工施工)															
施工															

▽施工位置図 (完成イメージ)

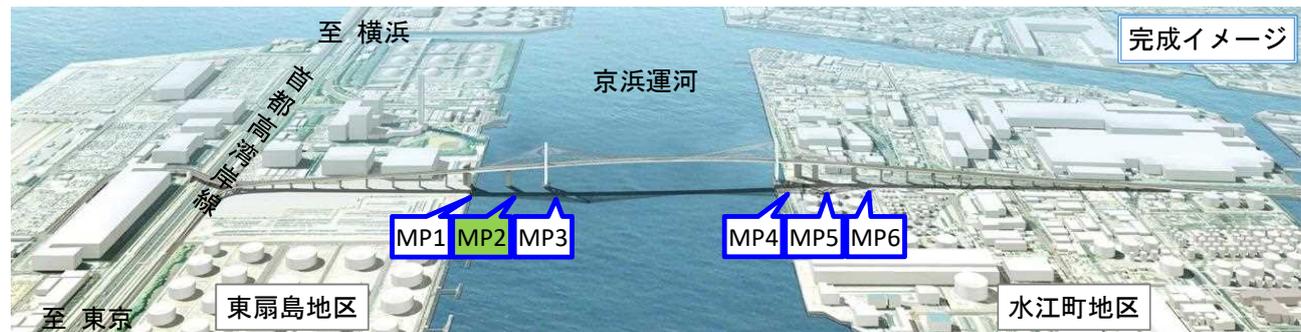



基礎・橋脚工

(MP2橋脚構築(躯体8ロット目))

【鉄筋組立作業】




【コンクリート打設作業】



【型枠組立作業】



【橋脚完成】

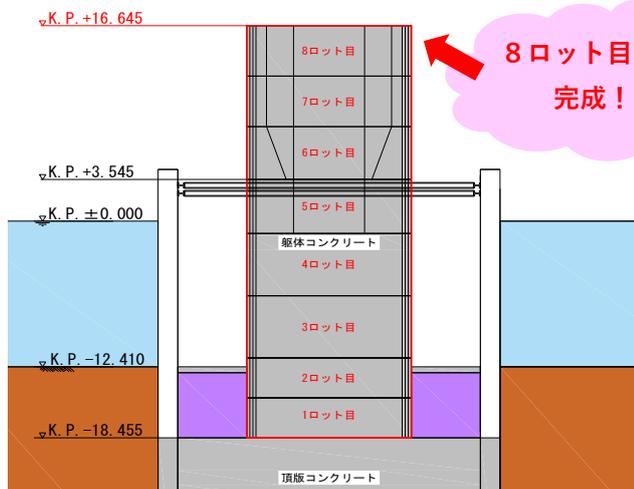

8ロット目まで完成!

橋脚躯体の施工完了!
本工事最後の8ロット目まで作業が完了して、躯体が完成したよ!
8ロット目の高さはK.P.+16.645mで、躯体の一番下からの高さは35.1mになるんだ!
次は鋼杭引き抜きをしていくよ!~
※K.P.・・・川崎港工事基準面

