

# 川崎港東扇島～水江町地区臨港道路整備事業 工事レポート 令和6年11月



## 京浜港湾事務所

工 事 名 令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事

工 期 令和6年9月2日 ～ 令和8年3月31日

施工会社 三井住友・みらい・日本ピーエス特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事は、京浜運河をまたぐ斜張橋のうち、東扇島側のMP1橋脚～MP3橋脚間のMP1柱頭部、MP3柱頭部、閉合部、接合部、架設外ケーブルを施工します。

### ●本工事の施工記録



東京側より全景  
MP1柱頭部・MP3柱頭部施工  
令和6年10月



横浜側より全景  
MP1柱頭部・MP3柱頭部施工  
令和6年10月



水江町側より全景  
MP3柱頭部施工  
令和6年10月

### ●進捗状況・お知らせ

本工事は上部工事(その3)(張出架設(15BL/15BL))終了後の、MP1柱頭部(1ロット/2ロット:コンクリート打設2回の1回目分)およびMP3柱頭部(1ロット/3ロット:コンクリート打設3回の1回目分)に向け足場・型枠・鉄筋・PC施工を行っています。




## 川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年 度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
測量・調査・設計(施工検討含む)																			
用地取得調整・工作物移設																			
関係者調整等(近接施工・上部工施工)																			
施工(工場製作・主塔架設・桁架設)																			

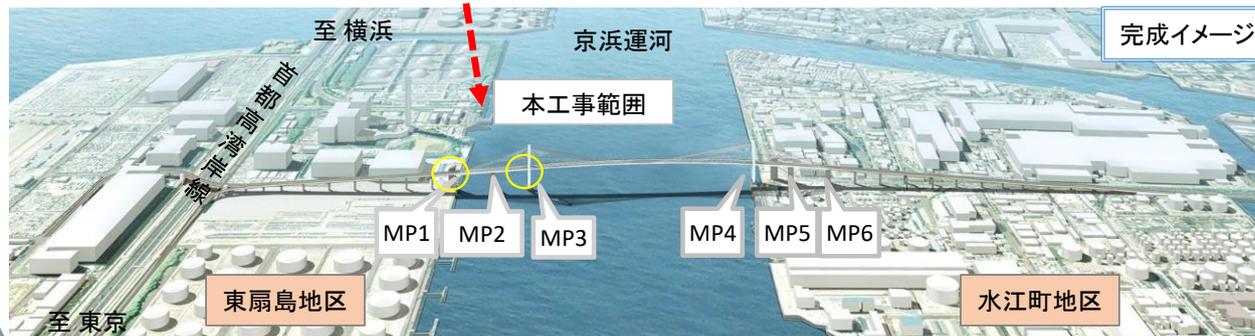

令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事



MP1・MP3柱頭部施工




図面通りに型枠を組立てていくよ。複雑な形状をしているね。

クレーンを使って鉄筋を運んで来て、図面通りの位置に鉄筋を組立てるよ。いったい何本鉄筋を使っているんだろう？




型枠組立 MP1

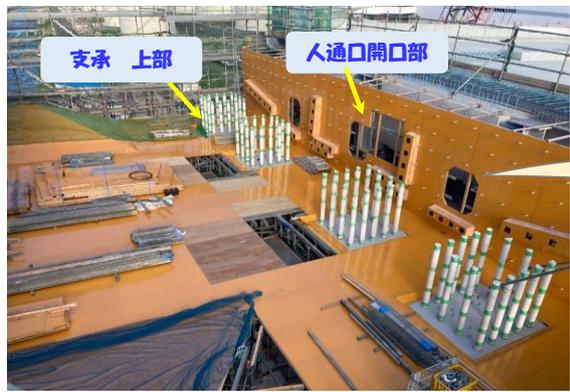

鉄筋・PC組立 MP1



現場全景

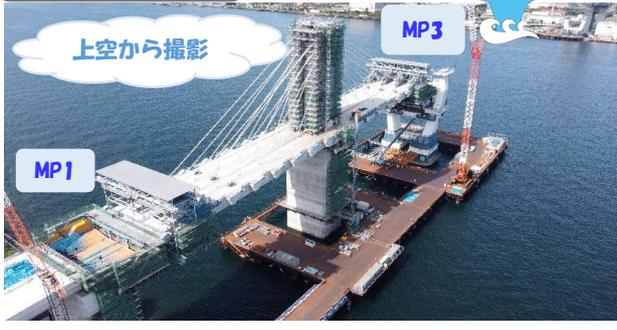

支保工の設置 MP3



型枠の下の状況だよ。縁の下の力持ちってところかな。この上に大引き受けジャッキ、大引き、根木、せき板(型枠材)が乗るよ。

