

川崎港東扇島～水江町地区臨港道路整備事業 工事レポート 令和 7年 2月



京浜港湾事務所

工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事

工期 令和6年9月2日 ～ 令和8年3月31日

施工会社 三井住友・みらい・日本ピーエス特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事は、京浜運河をまたぐ斜張橋のうち、東扇島側のMP1橋脚～MP3橋脚間（延長170m）のMP1柱頭部、MP3柱頭部、閉合部、接合部、仮斜材張力調整、架設外ケーブルを施工します。

●本工事の施工記録



MP1柱頭部・MP3柱頭部施工
令和6年10月



MP1柱頭部・MP3柱頭部施工
令和7年2月



水江町側よりMP3柱頭部施工状況
令和7年2月

●進捗状況・お知らせ

本工事は上部工事(その3)(張出架設(15BL/15BL))終了後の、MP1柱頭部(2ロット/2ロット:コンクリート打設2回の2回目分)およびMP3柱頭部(2ロット/3ロット:接合部1ロットを含めコンクリート打設3回の2回目分が施工済)、足場・型枠・鉄筋・PC施工を行っています。




川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
測量・調査・設計(施工検討含む)																			
用地取得調整・工作物移設																			
関係者調整等(近接施工・上部工施工)																			
施工(工場製作・主塔架設・桁架設)																			

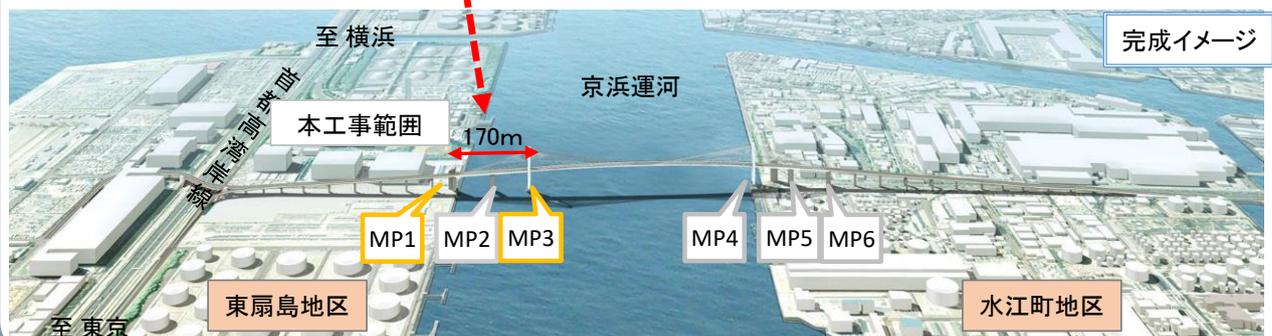

完成イメージ

川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事



MP1・MP3柱頭部施工



鉄筋組立完了後の様子だよ。
明日はいよいよコンクリート打設。
完璧な状態に組みあがっているか
最終確認はできたかな？

きれいにコンクリートを均し
終わったね。この後、寒さで
コンクリートが凍ってしまわ
ないように給熱養生をするよ。



鉄筋・PC組立完了

MP1
2ロット目



コンクリート打設後の様子

MP1
2ロット目




現場全景



上空から

鉄筋・PC組立完了

MP1
10ロット目

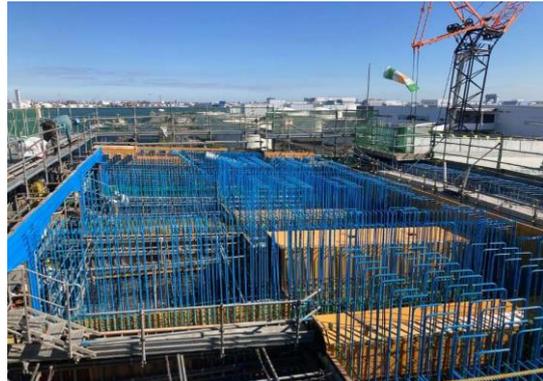

地上から

大きすぎて1度にコンクリートを
打つことができないから、柱頭部は
2回に分けて施工しているよ。

