



京浜港湾事務所

工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事（その2）
 工 期 令和6年10月24日 ～ 令和8年3月27日
 施工会社 鹿島・東亜特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、京浜運河をまたぐ斜張橋のうち、水江町側のMP4橋脚～MP6橋脚間（延長170m）のMP6柱頭部、MP4柱頭部、閉合部、接合部、仮斜材張力調整、架設外ケーブルを施工します。

●本工事の施工記録



上部工事 MP5・6橋脚状況
令和3年4月



MP5橋脚張出施工状況
令和6年10月



MP4～6橋脚張出施工等状況
令和7年2月

●進捗状況・お知らせ

すでに張出し施工部の最終15BLのコンクリート打設が終わりPC張出架設が完成しました。今後は側径間上部工事(その2)によりMP4,MP6の柱頭部、閉合部の施工を行っていきます。現在は、ワーゲンの撤去が終わり、MP6柱頭部を施工するための支保工(次ページ写真を参照)を組み立てているところです。




川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
測量・調査・設計(施工検討含む)																			
用地取得調整・工作物移設																			
関係者調整等(近接施工・上部工施工)																			
施工(工場製作・主塔架設・桁架設)																			

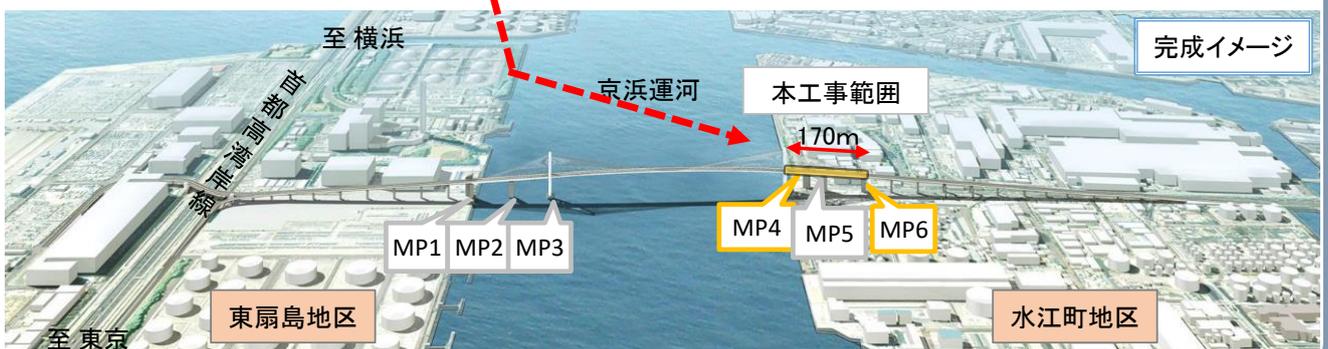

完成イメージ


川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事(その2)

柱頭部(橋脚上の橋桁部分)工事



ワーゲン解体

ワーゲンは大きいから、小さく解体してから地面に降ろすよ

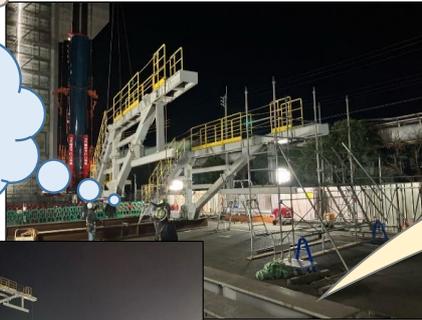

足場組立

橋の上で作業をしたいから、登るための足場を組み立てるよ



部材が道路の上を通るときは危ないから誘導員さんが車を止めるよ

支保工組立

柱頭部を造るために支保工を組み立てるよ
道路の上での作業になるから車の少ない夜間に作業をするんだ



造った橋が下がらないようにベントで下から支えるよ

作業場所ができた!

