



京浜港湾事務所

工 事 名 平成25年度横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線 (VI工区) 橋梁下部工事  
 工 期 平成25年6月21日 ~ 平成27年1月23日  
 施工会社 東洋・オリエンタル白石特定建設工事共同企業体  
 工事内容 横浜港臨港道路の整備事業として、ニューマチックケーソン工法で橋脚2基を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図

●今月の工事予定

内容	平成25年12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
ニューマチックケーソン基礎工							
ケーソン基礎構築	(Blue bar spanning all days)						末広ヤード
仮設工							
ケーソン据付準備		(Blue bar spanning from day 10 to 25)					南本牧ヤード

●お知らせ

橋梁下部工の施工のためニューマチックケーソンのケーソン基礎部を鶴見区末広町にて陸上製作しています。今月はケーソン基礎の鋼殻部材組立を行います。  
 南本牧ヤードではケーソン据付準備を行います。またケーソン据付は、1月下旬～2月中旬で行います。

今月の作業内容

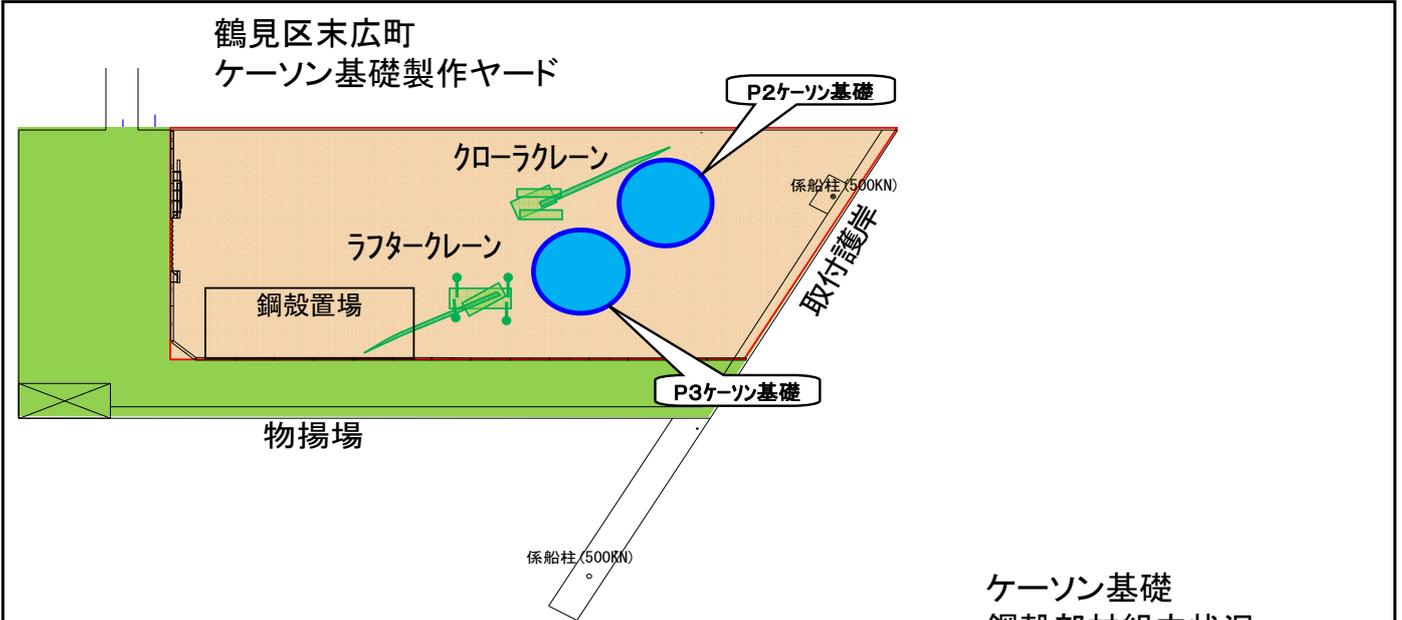


写真-1 ニューマチックケーソン基礎工 鋼殻部材組立



ケーソン基礎  
鋼殻部材組立状況

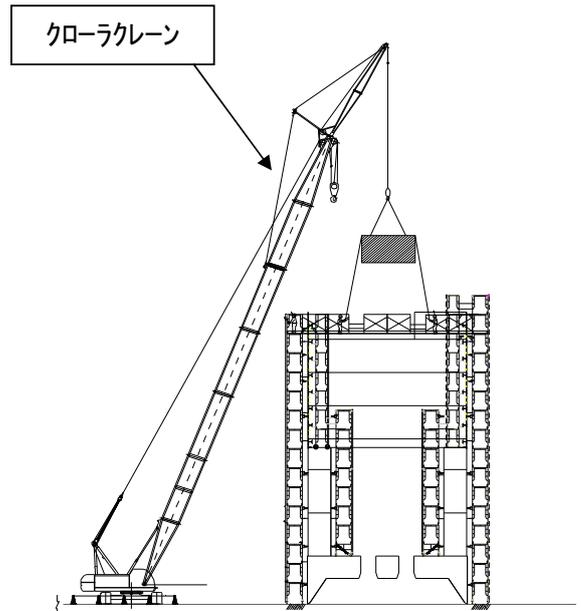


写真 ニューマチックケーソン基礎工 鉄筋組立

