



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線 (VI工区) 橋梁下部工事
 工 期 平成24年11月9日～平成26年2月7日
 施工会社 株式会社大本組
 工事内容 横浜臨港道路の整備事業として、ニューマチックケーソン工法で橋脚を1基構築する工事です。

●工事箇所の詳細図




●今月の工事予定

内容	平成25年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
鋼殻付ケーソン基礎積込・運搬・据付	■	■					
鋼殻ガイド撤去			■				
作業員通路設置			■				
ケーソン頂版(4ロット)構築				■	■	■	

●お知らせ

鋼殻付ケーソン基礎を横浜市鶴見区末広から中区かもめ町へ運搬します。積込・据付には3,000tの起重機船、運搬には7,000tの台船を使用します。期間中は周辺海域を航行する船舶に支障がないよう安全管理に留意いたしますので、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

今月の作業内容

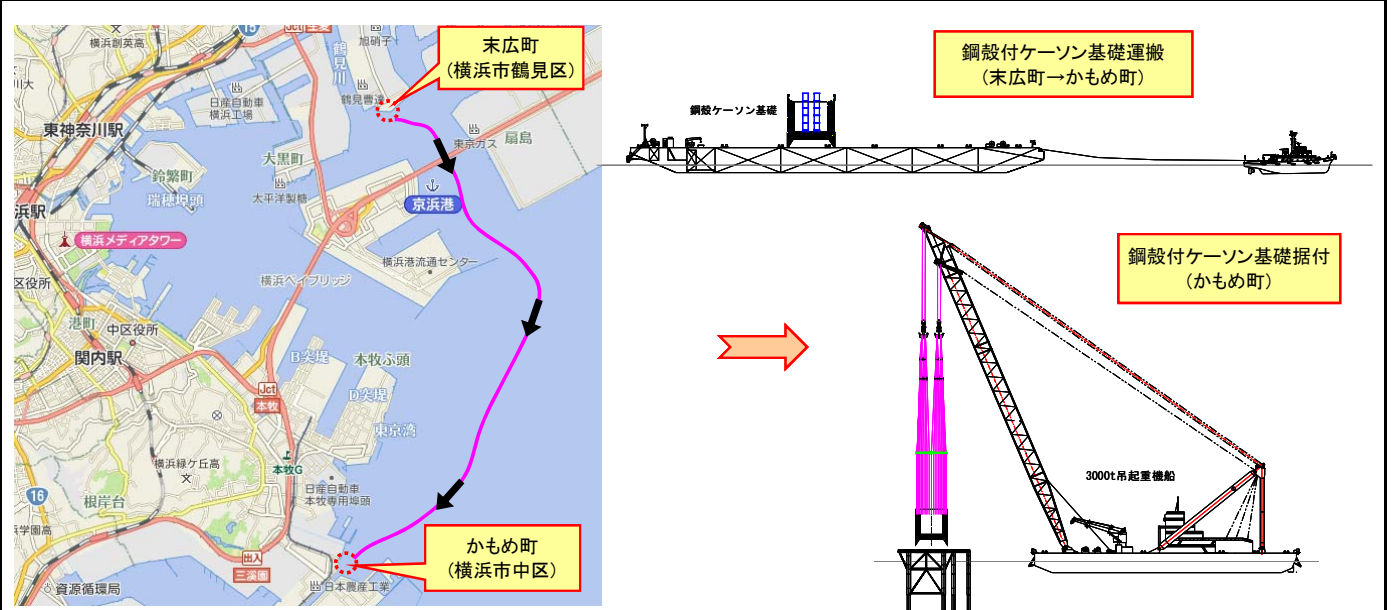

写真①

横浜市鶴見区の末広岸壁でニューマチックケーソン基礎(1~3ロット)を作っています。高さは14.6m、重さは2,100tあります。



写真②

横浜市中区のかもめ町岸壁でニューマチックケーソン基礎を据付ける準備工事をしています。
