




京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（本牧側擁壁部）擁壁築造工事
 工期 平成26年11月13日～平成27年9月30日
 施工会社 奈良建設株式会社
 工事内容 本工事は、横浜臨港道路整備事業の擁壁築造工事における重力式擁壁工、U型擁壁工、地盤改良工、基礎工、舗装工事他を施工するものです。

●工事箇所の詳細図

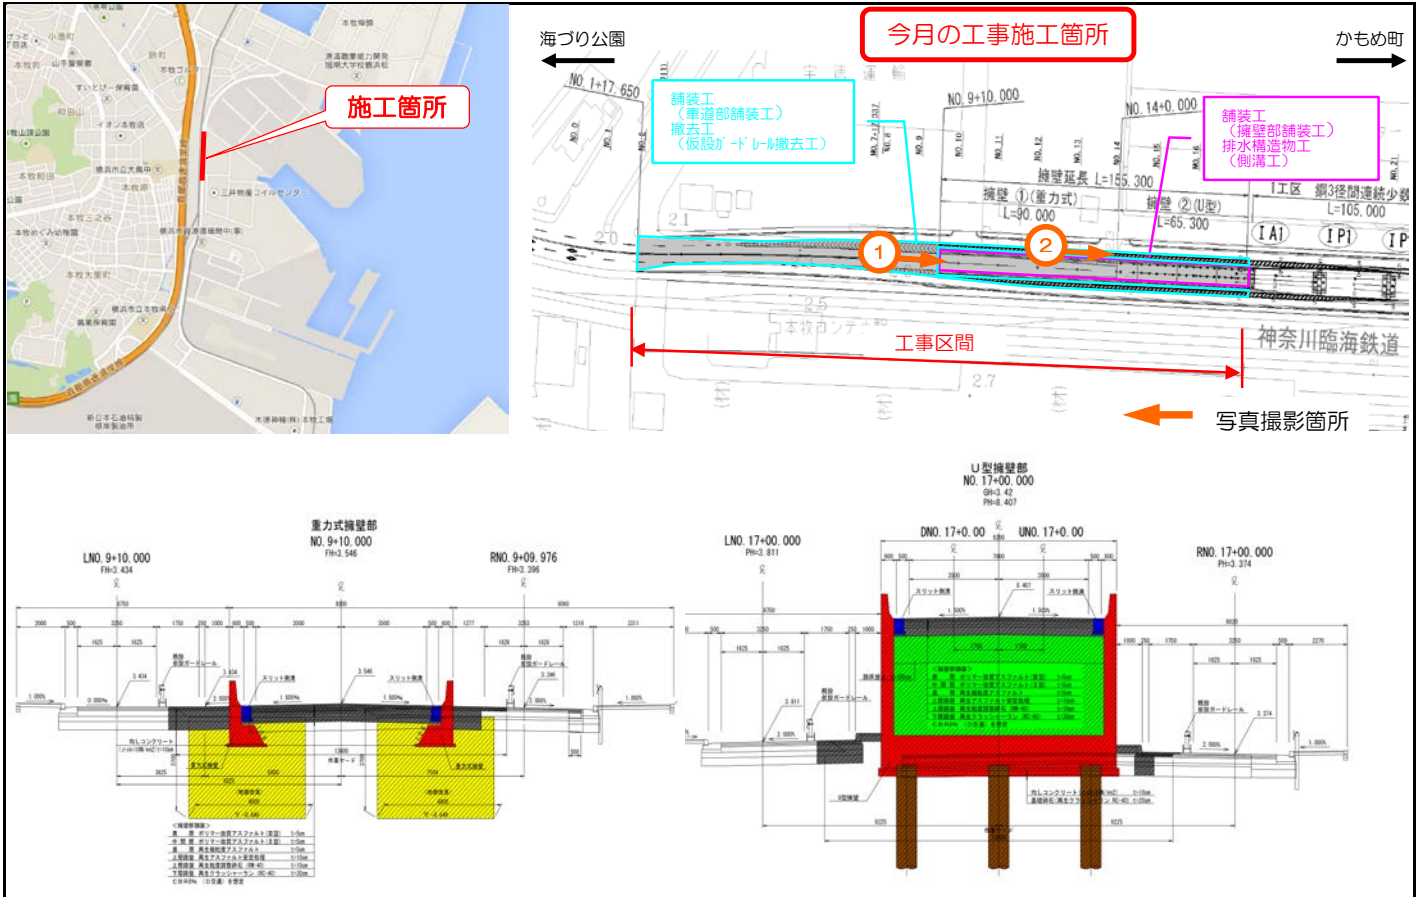

●今月の工事予定

内容	平成27年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
舗装工							
車道部舗装工	[Blue bar from 5 to 30]						
擁壁部舗装工	[Pink bar from 5 to 30]						
排水構造物工							
側溝工	[Pink bar from 5 to 15]						
撤去工							
仮設ガードレール撤去工				[Blue bar from 20 to 25]			

※ 施工箇所の枠組み色に対応しています。

●お知らせ

作業時間は、原則として月～土曜日の8:00～17:00及び21:00～6:00となります。(作業の都合上、若干変更する場合がございます) 昼間の作業は常設作業帯の中で行いますが、夜間作業は交通規制(片側交互通行)を実施し、舗装や仮設ガードレールの撤去を行う予定です。ご通行の皆様並びに沿道企業の皆様には大変ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

写真 今月の作業内容


写真① 擁壁部舗装工(路盤転圧状況)



写真①

現在は、擁壁が完成し道路の施工を行っています。今月は、両サイドの側溝を設置した後、上層路盤やアスファルト舗装の施工を行う予定です。

写真② 車道部舗装工(舗装転圧状況)

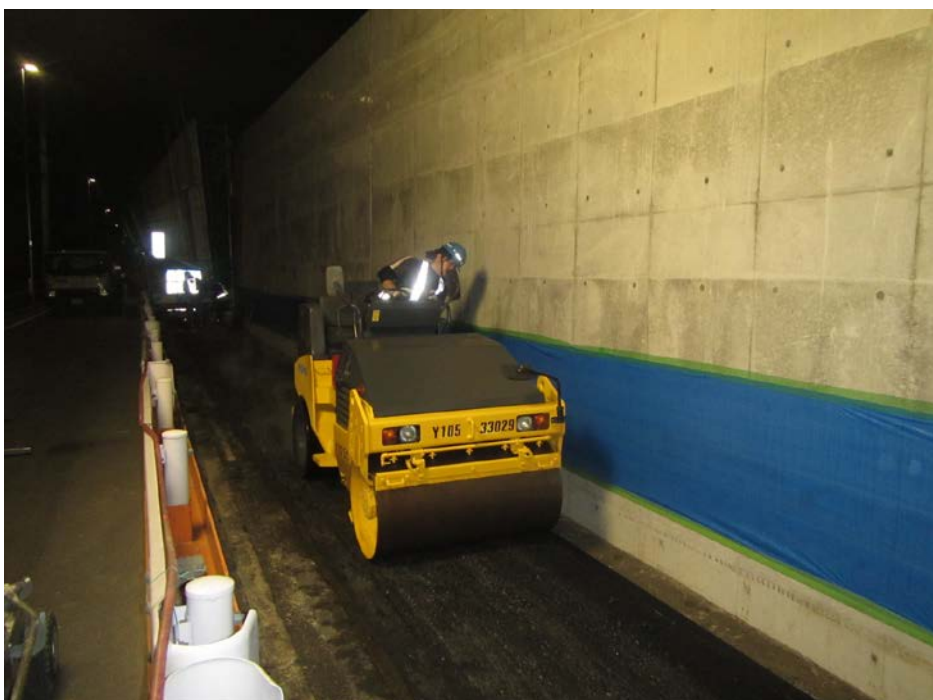

写真②

現道に近接する箇所の舗装工事を夜間作業にて行っています。今月も引き続き舗装工事を行い、完了した箇所より区画線の設置を行い、完成形にする予定です。
