

京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（VI工区）橋梁上部工事
 工期 平成25年10月23日～平成28年3月15日
 施工会社 川田工業・日立造船特定建設工事共同企業体
 工事内容 横浜港臨港道路の整備事業として、3ブロックに分割した鋼3径間連続鋼床版箱桁橋を、大型起重機船による大ブロック一括架設工法で構築する工事です。

●工事箇所の詳細図



●今月の工事予定

内容	平成27年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
鋼橋架設工							
地組工(足場設置等)	完了						
地組工(仮設備解体等)	完了						ベント設備等
橋体架設工	完了						大ブロック浜出し・輸送・架設


●お知らせ

工場製作された鋼桁は、地組ヤードにて平成27年8月下旬に、3ブロックに分割した鋼3径間連続鋼床版箱桁橋の地組立が完了しております。
 現在、地組立の完了した大ブロックから順次足場設備等の設置作業を行い、完了した大ブロックから浜出し・輸送・架設を進めております。
 大ブロック①は、海上輸送を行い、9月6日に架設を行いました。

写真① 今月の作業内容


写真① 鋼橋架設工：大ブロック輸送工

地組立が完了した大ブロック①を鋼台船上に積込、架設位置まで輸送しました。

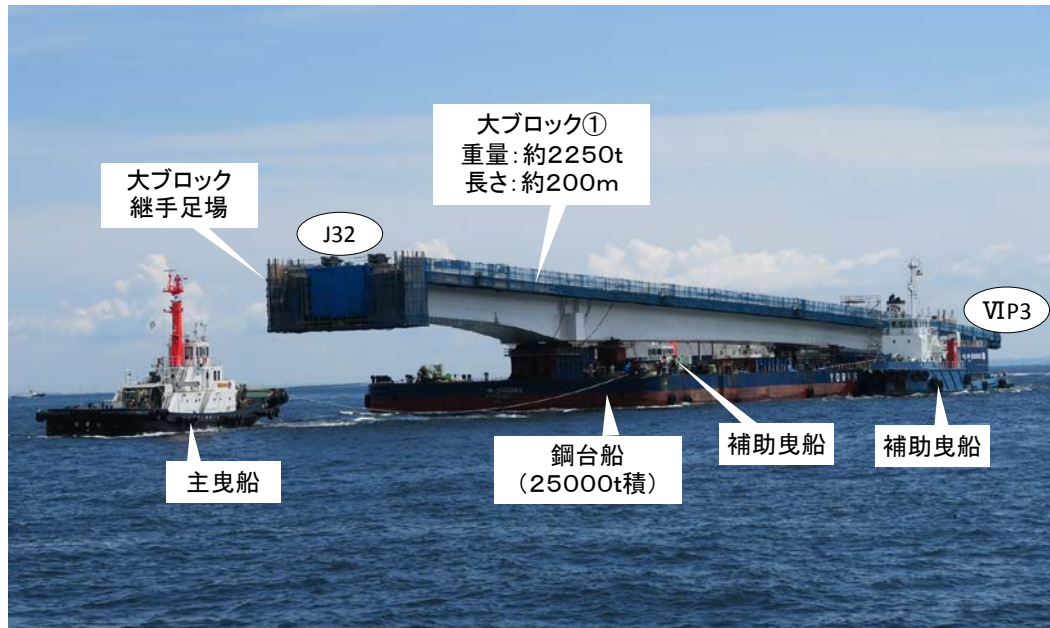

写真② 鋼橋架設工：大ブロック架設工

架設位置まで輸送された大ブロック①を大型起重機船にて橋脚上に一括架設しました。

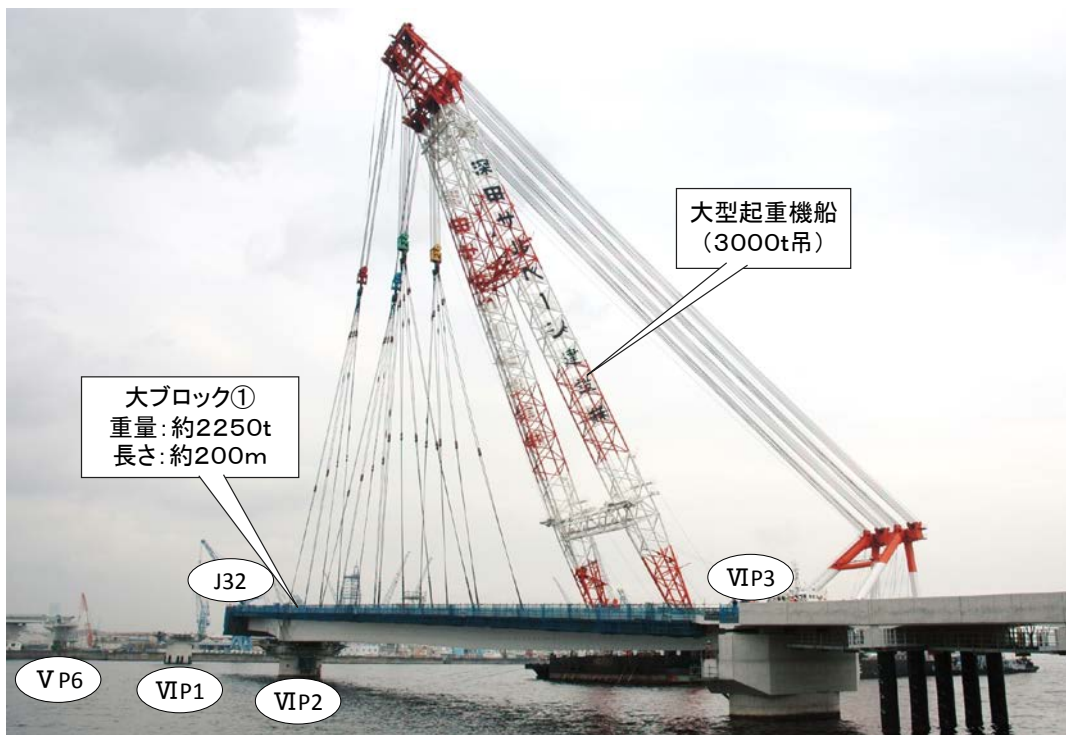

今後大ブロック②・③の浜出し・輸送・架設を繰り返す、平成27年10月上旬に架設完了予定です。
