


今月の作業内容

鋼管杭打設状況
(パイロハンマー)

写真

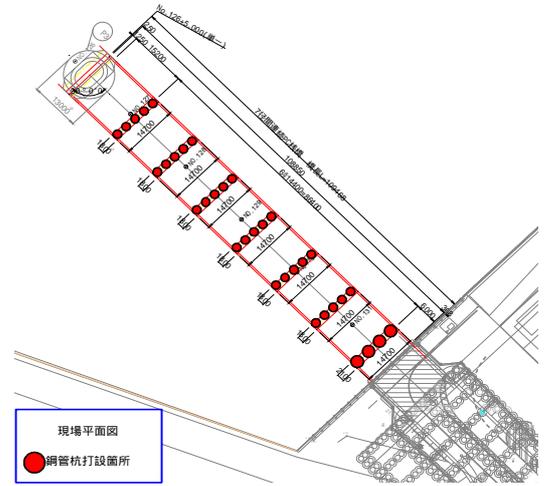

鋼管杭打設状況
(油圧ハンマー)

写真



現在は、鋼管杭打設作業を行っています。
鋼管杭は全部で、34本打設します。
鋼管杭の打設は、パイロハンマーと油
圧ハンマーを併用します。
鋼管杭の径は1.2mと1.5mです。
(写真 作業全景)

仮設栈台撤去状況

写真



南本牧臨港道路(工区)における橋脚
およびPC桁橋の築造工事に伴い、仮設通
路として使用した仮設栈橋の撤去を行
います。写真は、P3橋脚付近の仮設栈橋
を撤去している状況です。
(写真 作業全景)
