


～ 埋立部：管中混合処理土の打設開始～

～ 接続部：鋼管矢板井筒護岸のドライアップ開始～

埋立部

- ・平成20年10月21日に護岸部背後の管中混合処理土を打設開始。(11/10から3船団)
- ・海底からの浚渫土に固化材(セメント)を添加し,埋立材料として有効利用している。固化処理する事により,軽量化や強度向上が図られ護岸の安定性が向上する。

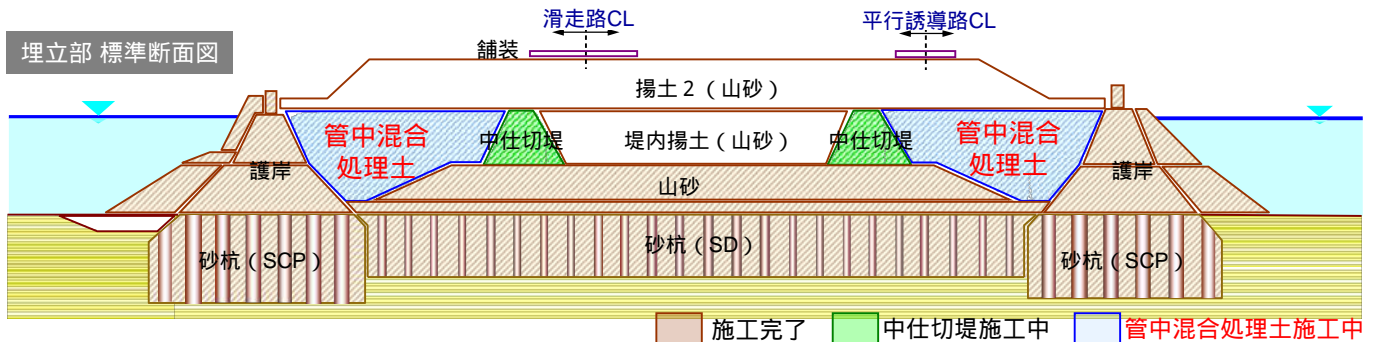

1 資材投入ボリュームに対する比率

埋立 / 棧橋接続部

- ・平成20年11月20日に鋼管矢板井筒護岸内部のドライアップを開始。
- ・引き続き,鋼管井筒内部を排水し,上部構造(コンクリート工)を急ピッチで構築していく。

