



PC桁架設工


平成21年6月25日

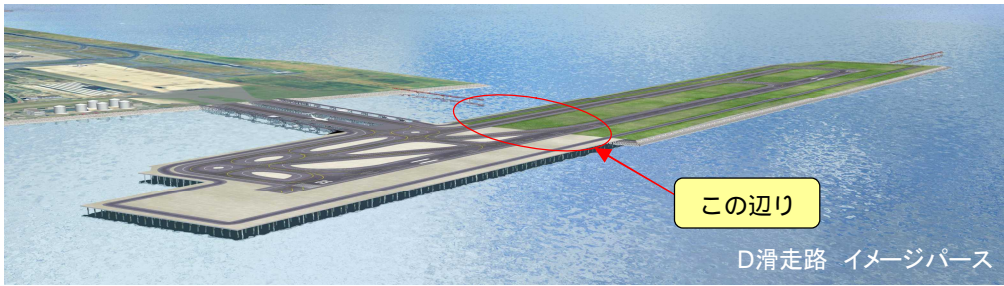

埋立部	棧橋部
接続部	連誘部
環境	その他
工種名: PC桁架設工	

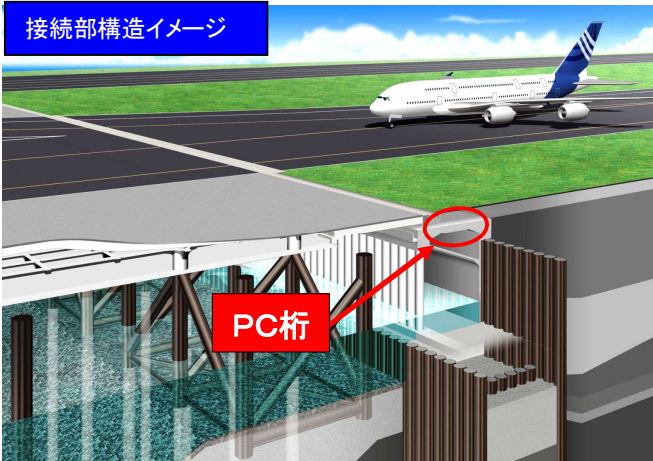

現在、接続部では、鋼管腐食防止コンクリートの施工、スリット柱の建込に続き、PC桁架設工が施工されています。PC桁は、長さ9.9m、幅約0.9mのプレレストコンクリート桁です。現在、全440本の架設が完了しました。今後は、PC桁間に間詰めコンクリートを打設し、滑走路直角方向にプレストレス(緊張力)を導入し、接合部に鉄筋を組み立て、コンクリートを打設していきます。

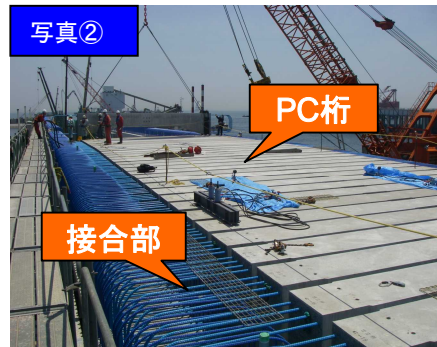

写真①は、PC桁をクレーンで架設している様子です。架設後は、写真②のようになります。その後、間詰めコンクリートを打設します。写真③は間詰めコンクリートを養生しているところです。右の写真は、現在の井筒護岸内部の様子です。7月末から8月上旬には、棧橋側の鋼管矢板が切断され、井筒護岸内は海水に浸水します。



💡 昨年の井筒護岸内部の様子は[コチラ](#)をクリック
