




埋立部	栈橋部
接続部	連誘部
環境	その他
工種名：軽量混合処理土工	

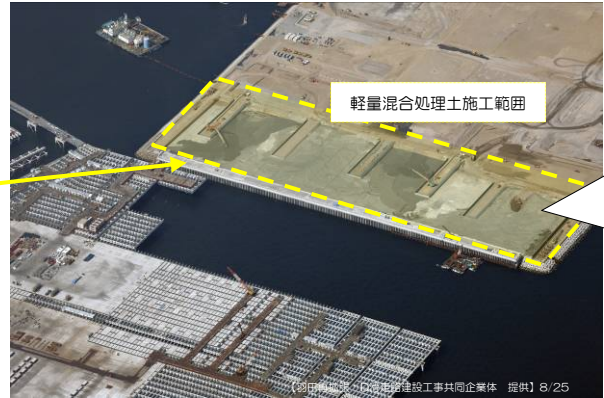

軽量混合処理土は、この灰色で見えている部分です。

前回紹介した『軽量混合処理土（SGM）』について最近の現場状況をお伝えします。  
5月の施工開始以来、順調に作業が進み、約8割の打設が完了しております。（高さにして約1.1mの打設が完了。接続部護岸の天端付近まで上がってきました。）





写真は、SGM用の型枠。この型枠の高さは1枚約2m程度の高さがあります。



護岸の法面は、ピラミット形状を模した用に施工していきます。

▼接続部背面の天端付近まで打設が完了。  
※沈下を考慮し、型枠付近まで打設します。

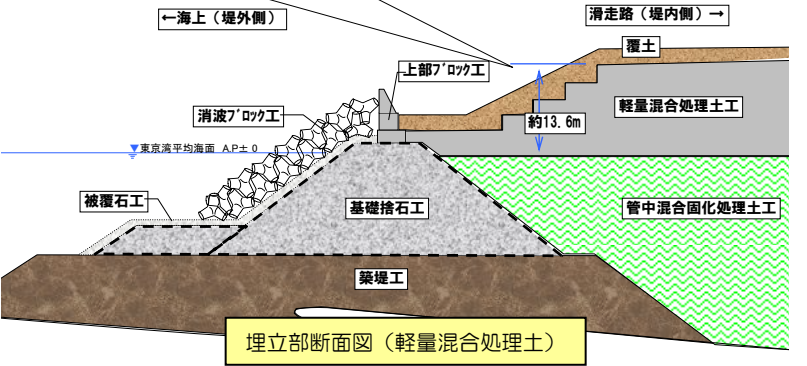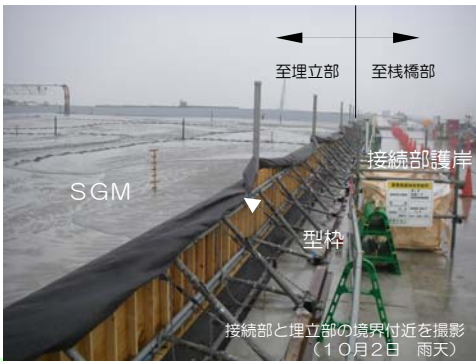

▼D滑走路展望台には、SGM、管中混合固化処理土、コンクリート、山砂の比重の違いを確認できるように供試体を展示しています。是非、一度足を運んでみて下さい！

▼展望台へのアクセス方法は[こちら](#)

