




京浜港湾事務所

工事名 横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)築造工事
工期 平成26年 5月26日～平成27年 3月25日
施工会社 東亜・若築・あおみ特定建設工事共同企業体
工事内容 本工事は、横浜港南本牧ふ頭地区整備事業として、鋼板セル工法で岸壁を築造する工事です。

●工事箇所の詳細図

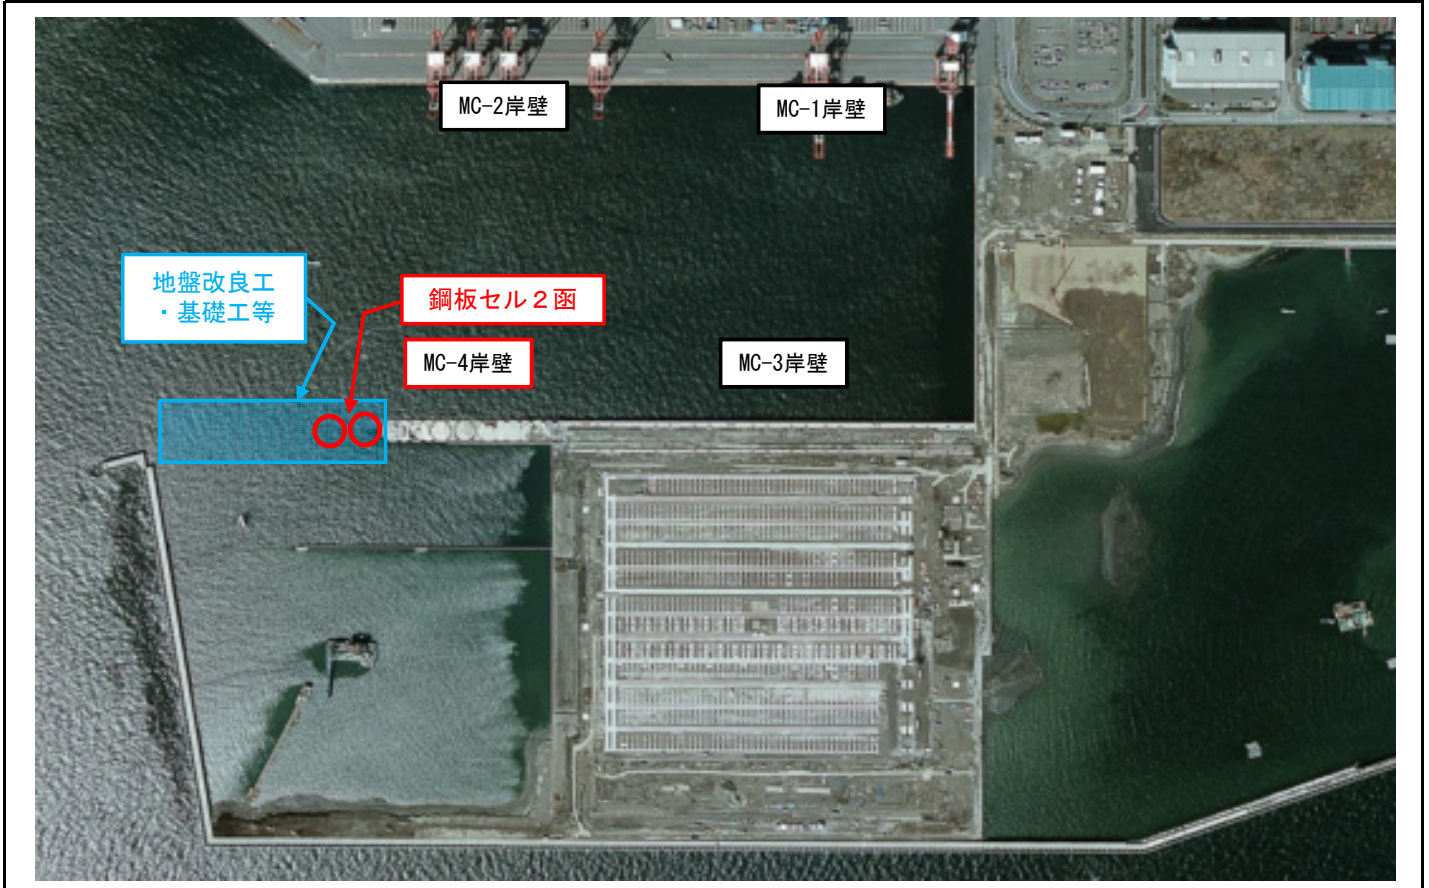

●今月の工事予定

内容	平成27年3月						備考
	5	10	15	20	25	31	
基礎工 盛石	■						
裏込工 裏込石	■						
本体工 蓋コンクリート		■					
付属工 電気防食		■					
後片付工				■			

●お知らせ

今月は本体工の蓋コンクリート、基礎・裏込石の投入及び電気防食工を施工します。工事は今月末で完了します。近隣の皆様には大変ご不便をお掛けしますが、工事へのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

今月の作業内容

写真①

【盛石投入】

鋼板セルの前面側に盛石を投入（厚さ7.5～10m）して、岸壁を安定させます。



盛石積載状況



ガット船
(499 t 級)



潜水士船
(200ps 級)

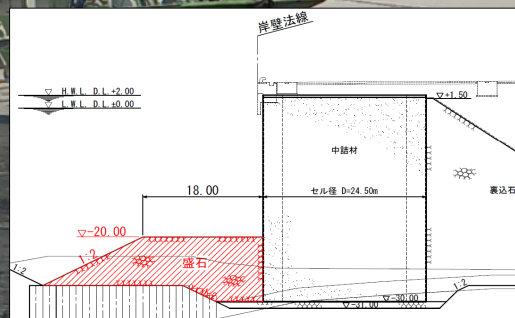


写真②

【蓋コンクリート打設】

鋼板セル据付・中詰完了後、天端に蓋コンクリート（厚さ30cm）を打設します。

クレーン付台船
(120 t 吊)



工事名	横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)築造工事		
工種	本体工(セル)	位置	No.25セル
蓋コンクリート工			
コンクリート打設状況			
(クレーン付台船による打設)			
立会者	施工者 東亜・若築・あのみJV		

引き続き安全を最優先し、無事故・無災害で竣工できるように、工事を進めていきます。
