




京浜港湾事務所

工事名 横浜港南本牧地区岸壁(-16m)(耐震)鋼管杭打込等工事
 工期 平成22年6月22日～平成23年3月18日
 施工会社 五洋・本間・あおみ特定建設工事共同企業体
 工事内容 南本牧ふ頭MC-3のガントリークレーンを支える基礎杭を打設する工事です。

●工事箇所の詳細図

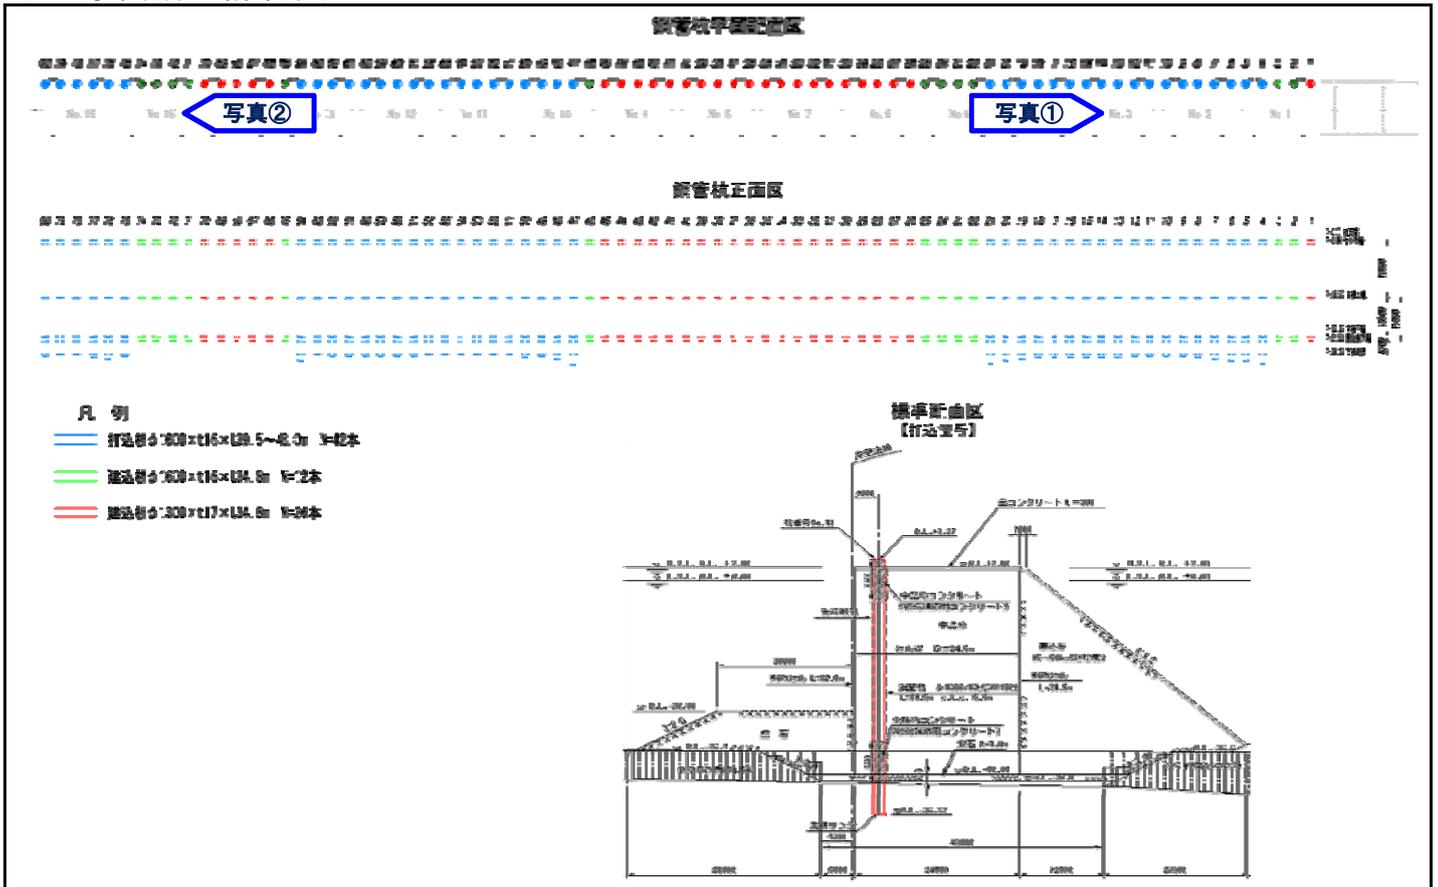

●今月の工事予定

内 容	平成22年10月						備 考
	5	10	15	20	25	30	
仮設備工	[Blue bar]						
重機搬入・組立	[Blue bar]						
先行掘削・鋼管杭工①	[Blue bar]						1号機 No. 1～13杭
先行掘削・鋼管杭工②	[Blue bar]						2号機 No.14～48杭
先行掘削・鋼管杭工③	[Blue bar]						3号機 No.26～35杭
先行掘削・鋼管杭工④	[Blue bar]						4号機 No.36～59杭
先行掘削・鋼管杭工⑤	[Blue bar]						5号機 No.60～80杭
昼間作業(7:30～17:00) [Blue bar]							

●お知らせ

作業時間は、月～土曜日 昼間:8時30分～17時00分となります。
 ふ頭関係者の皆様には、大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願ひします。

今月の作業内容

写真①



今月より、主工種であるクレーンレール基礎工の施工に着手しました。11月下旬にかけて打込杭42本(4組施工)の施工を行います。

品質を確保し、工期内無事故・無災害で工事を進めていきます。

写真②

