




京浜港湾事務所

工事名 横浜港南本牧地区岸壁(-16m) (耐震) 上部工事
工期 平成24年 3月 5日～平成25年 2月26日
施工会社 東亜・株木特定建設工事共同企業体
工事内容 頂部コンクリート×626m、上部コンクリート×432m
 被覆コンクリート×244m、PCa版製作・据付×31個
 土工・撤去工×1式、仮設道路整備×1式

●工事箇所の詳細図

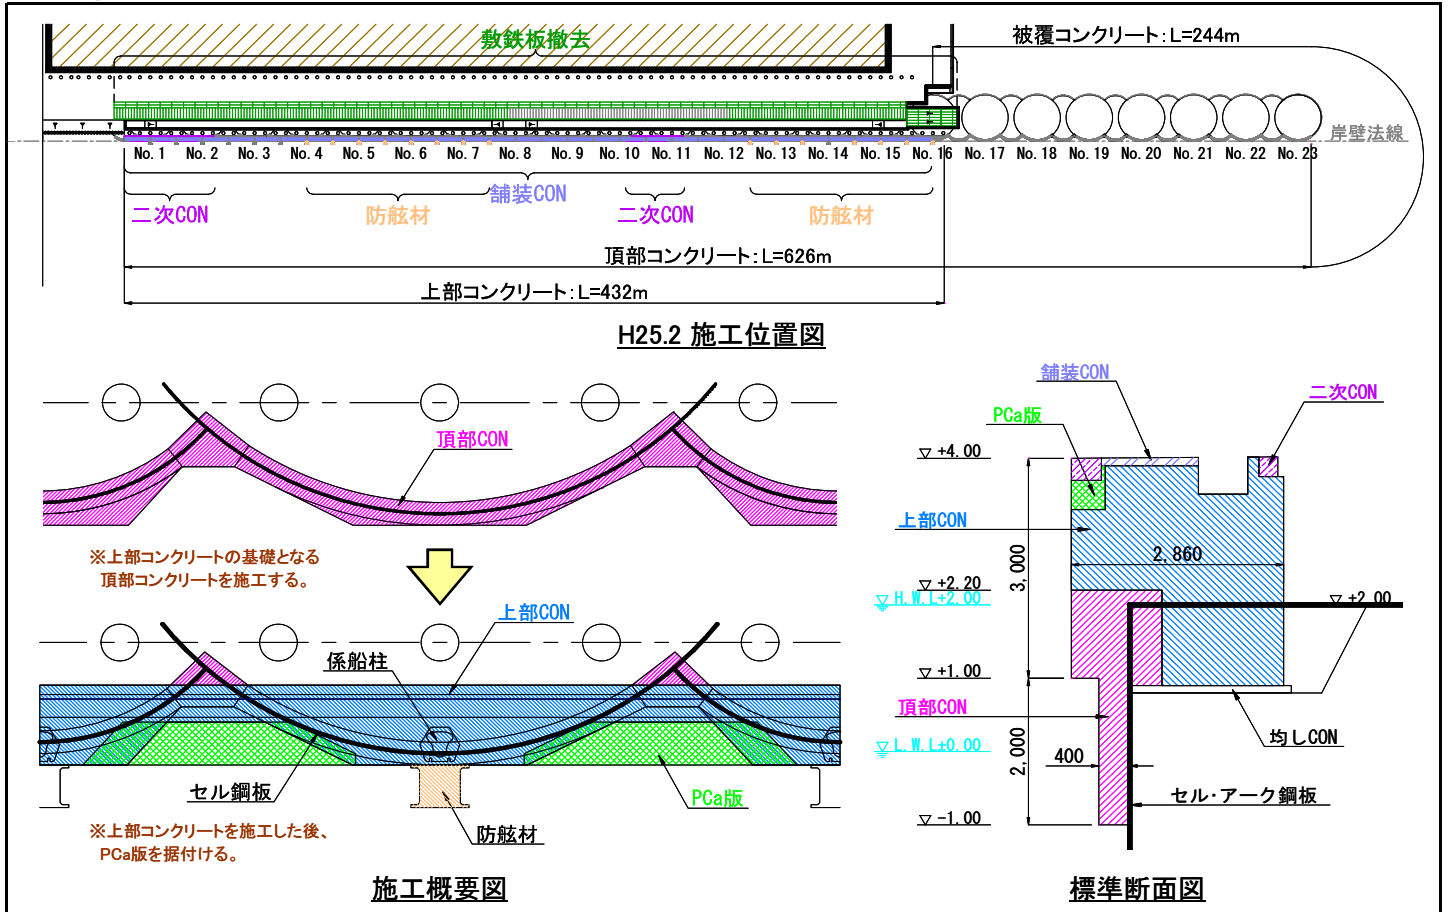

●今月の工事予定

内容	平成25年2月							備考
	5	10	15	20	25	26	31	
二次コンクリート	■							
舗装コンクリート	■							
防舷材	■							
敷鉄板撤去・後片付け		■						

契約工期

●お知らせ

■ 二次コンクリート施工中 (No.1、2、11セル・アーク)	■ 頂部コンクリート施工完了 (12/15)
■ 舗装コンクリート施工中 (No.1～16セル・アーク)	■ 上部コンクリート施工完了 (1/19)
■ 防舷材施工中 (No.4セル～8アーク、13アーク～16セル)	■ 被覆コンクリート施工完了 (12/18)
■ 敷鉄板撤去・後片付け	■ PCa版製作・運搬・据付完了 (1/31)

写真① 今月の作業内容

写真①



施工箇所全景

写真②



防舷材設置状況

※防舷材とは・・・
船舶が接岸するときに、船体及び係船岸の損傷を防ぎ、接岸力を減少させるため係船岸に取り付ける緩衝材。

防舷材
