


京浜港湾事務所



工 事 名 横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)築造工事
 工 期 平成29年3月9日 ~ 平成30年3月26日
 施工会社 東洋・あおみ・不動テトラ特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜港南本牧ふ頭地区整備事業として、
 鋼板セル工法で岸壁を築造する工事です。

工事箇所の詳細図

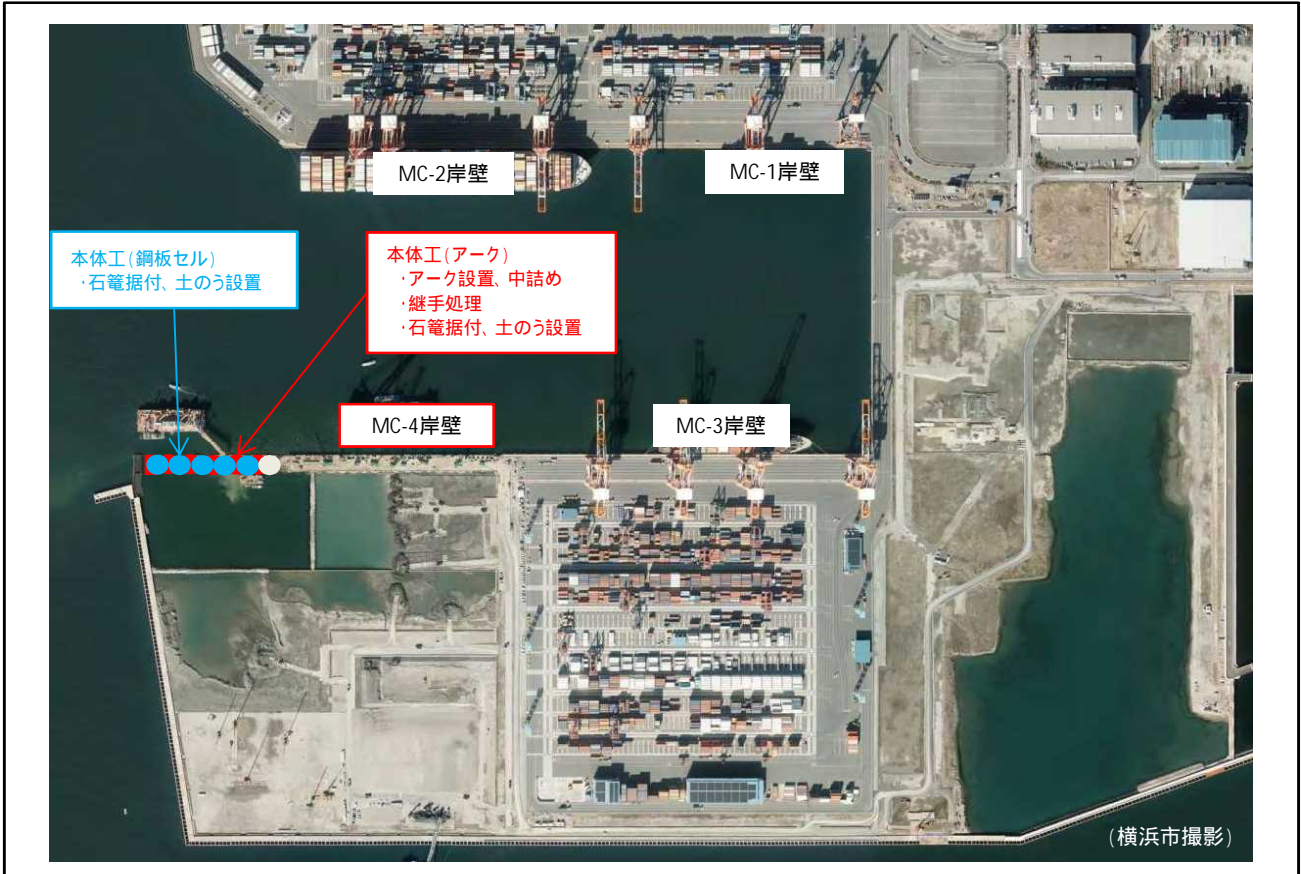

今月の工事予定

| 内容 | 平成30年3月 | | | | | | 備考 |
|------------|---------|----|----|----|----|----|---------|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | |
| 本工 | | | | | | | |
| アーチ設置・中詰め | ■ | | | | | | |
| 継手処理 | | ■ | | | | | |
| 石籠据付、土のう設置 | | | ■ | | | | |
| ヤード撤去復旧工 | ■ | | | | | | 富津製作ヤード |
| 後片付工 | | | | | ■ | | |

お知らせ

今月の南本牧地区は鋼板アーチ設置と中詰め及び継手処理、石籠据付、土のう設置を施工します。
 また、富津製作ヤードは鋼板セル/鋼板アーチの製作を完了したため、ヤード撤去復旧工を施工します。
 工事は今月末で完了します。
 近隣の皆様には大変ご不便をお掛けしますが、工事へのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

今月の作業内容

写真 鋼板セル(直径24.5m 高さ32m 重量約400t)を起重機船で据付けます。



写真 リクレーマ船で中詰材を投入します。

