


京浜港湾事務所




工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP4)橋梁下部工事
工期 平成27年 3月19日 ~ 平成29年 3月17日
施工会社 大成・東洋・大豊特定建設工事共同企業体
工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備や基礎構築（ニューマチックケソン工法）及び橋脚構築作業を行います。

工事箇所の詳細図

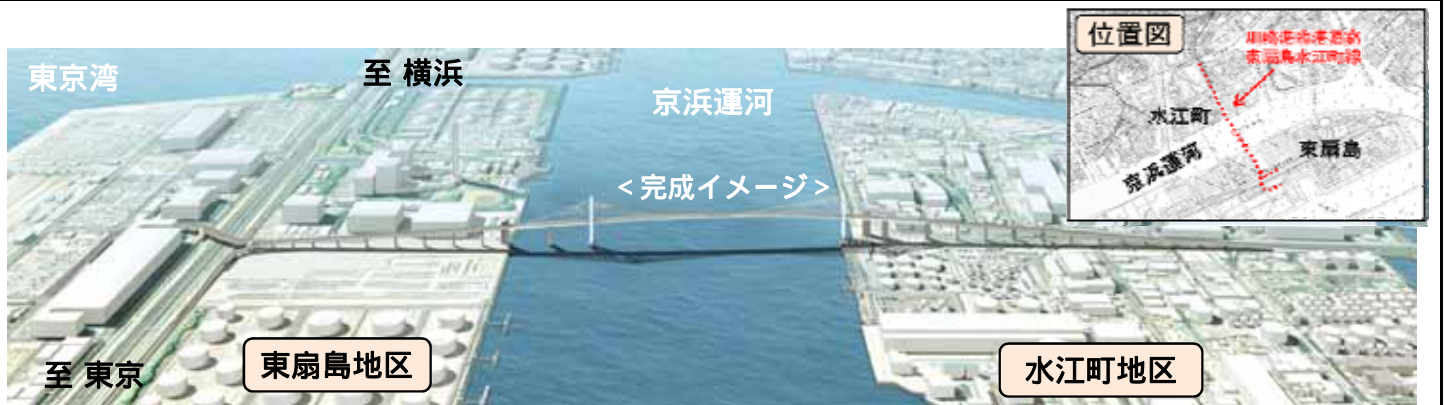

施工箇所平面図

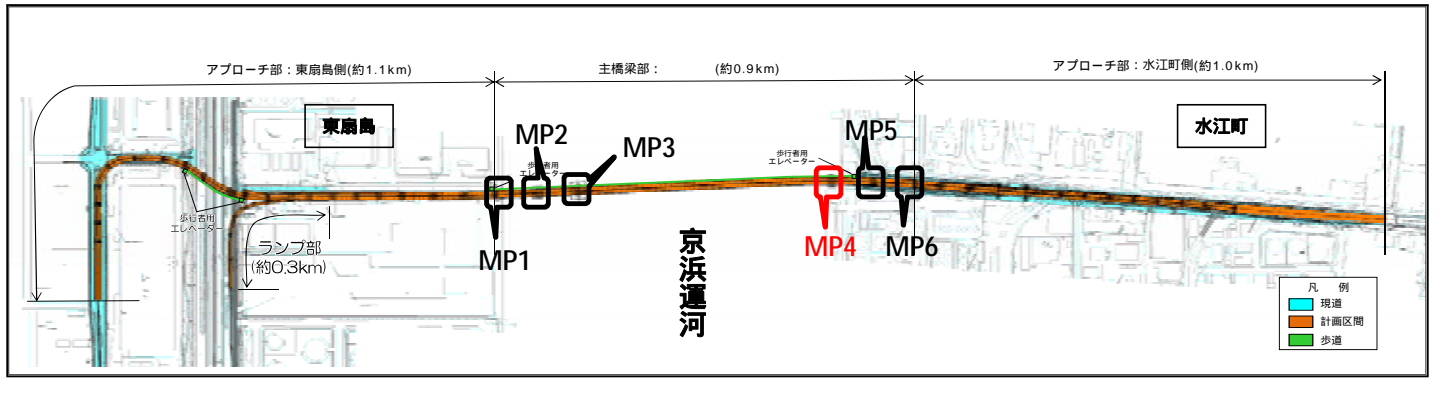

12月の工事予定

内容	平成28年12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
ニュ・マチックケソン工							
足場組立・解体	[Blue bar spanning 5-30]						
型枠脱型・組立	[Blue bar spanning 5-30]						
鉄筋組立	[Blue bar spanning 5-30]						
ケソン設備整備	[Blue bar spanning 5-30]						
外周埋戻し			[Blue bar spanning 15-20]				夜間作業

お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は昼勤8時から19時、12/12～12/17の夜間作業は19時から8時まで、12月の海上作業は有りません。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 12月の作業内容

写真

ニューマチックケーソン工
(基礎構築工)



躯体(第2ロット)
のコンクリートを
打設している状況
です。

写真

ニューマチックケーソン工
(基礎構築工)



躯体(第3ロット)の
足場組立を行って
いる状況です。
この後、鉄筋・型枠
の組立を行います。
