


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP5・6) 橋梁下部工事  
 工 期 平成27年3月19日～平成29年3月17日  
 施工会社 清水・五洋特定建設工事共同企業体  
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備  
 や基礎構築（ニューマチックケソン工法）及び橋  
 脚構築作業を行います。

工事箇所の詳細図

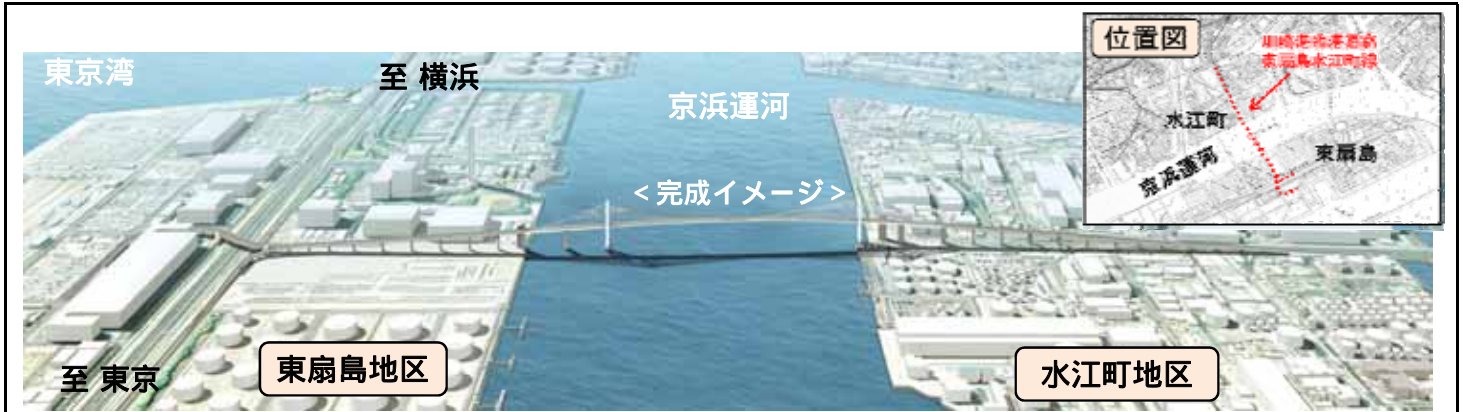

施工箇所平面図

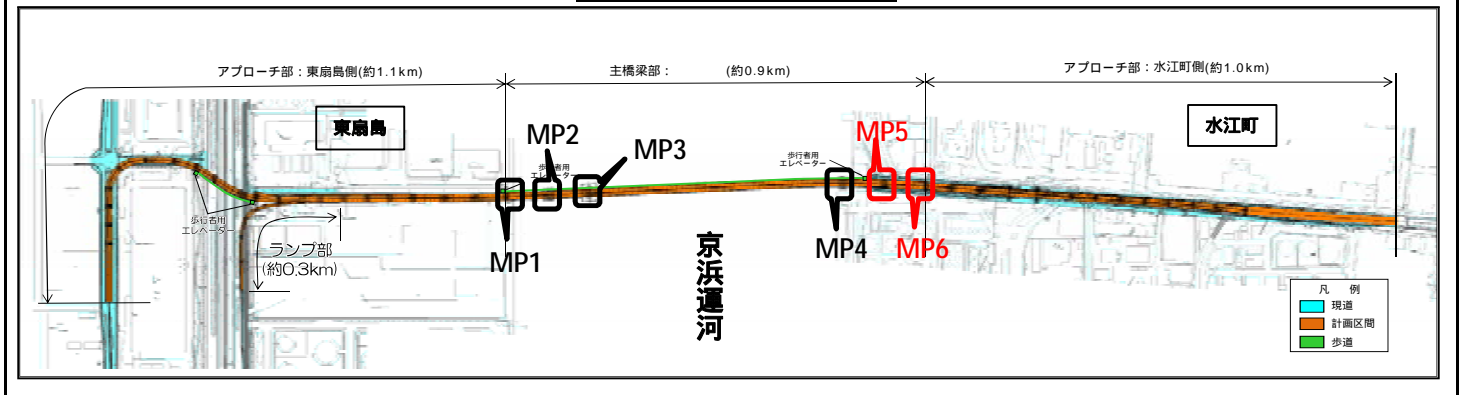

12月の工事予定

内容	平成28年12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
MP5橋脚基礎工							
鉄筋型枠コンクリート工 土砂受設備組立							12/22コンクリートを打設予定
MP6橋脚基礎工							
鉄筋型枠組立							

お知らせ

作業時間は、原則として作業は8時から17時となりますが、土砂受設備組立は道路規制をおこない、16時から翌3時の作業時間となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 12月の作業内容

写真

ニューマチックケーソン工  
(基礎構築工)



MP5(手前側)  
刃口金物据付、  
第1ロットの鉄  
筋組立状況で  
す。奥側はMP  
6です。

写真

ニューマチックケーソン工  
(基礎構築工)



MP6  
ニューマチック  
ケーソン最下部  
先端に刃口金  
物を据付してい  
る状況です。
