


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP4) 橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月19日～平成30年3月30日
 施工会社 大成・東洋・大豊特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備
 や基礎構築（ニューマチックケーソン工法）及び橋
 脚構築作業を行います。

●工事箇所の詳細図

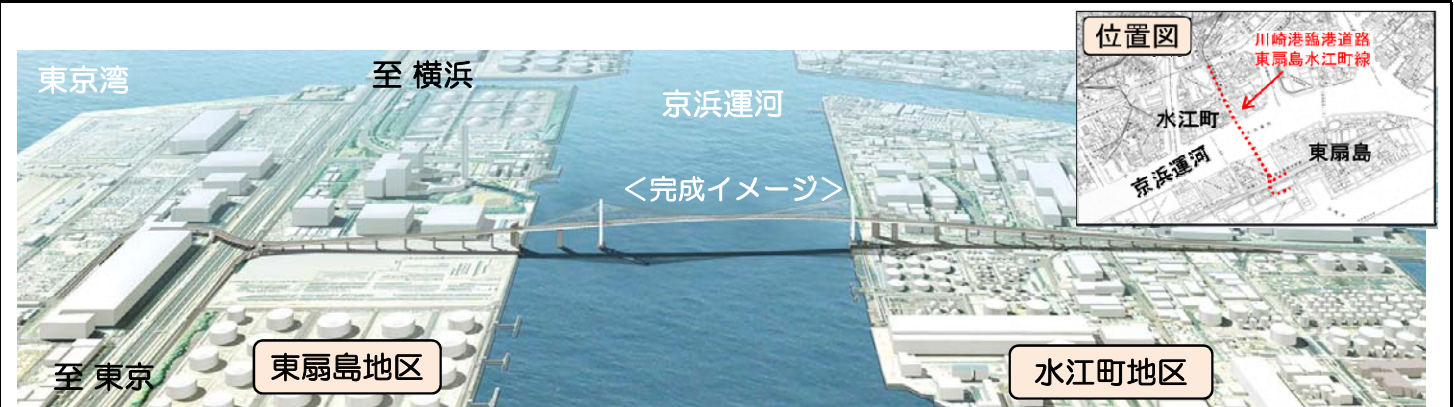

施工箇所平面図

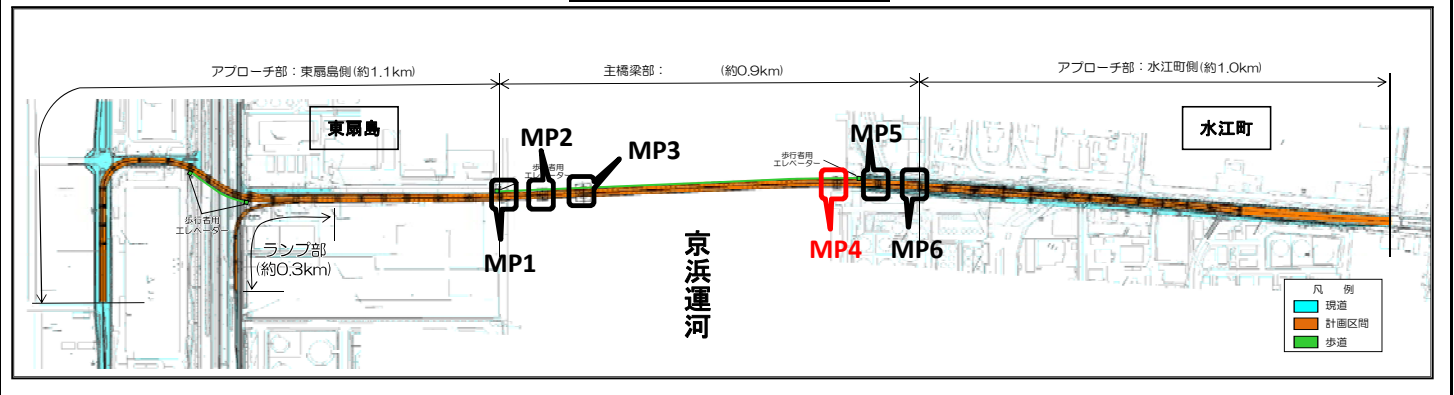

●3月の工事予定

内容	平成29年3月						備考
	5	10	15	20	25	30	
ニューマチックケーソン工							
沈下掘削工							夜間作業
鉄筋組立							
型枠組立							
コンクリート打設							3/24
型枠脱型							

●お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は昼勤8時から19時、沈下掘削は夜間19時から5時まで。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 主な作業状況

写真①



躯体(第3ロット)
のコンクリートを
打設している状況
です。

写真②



地下での沈下掘削
の現場状況。
電動掘削機4台

工事名	川崎臨港道路整備事業 京浜臨港道路 MP (掘削) 工事
ニューマシン	掘削機 4台
小電機	バックホウ × 4台
発注者	大成・東洋・大豊特定建設工事共同企業体
