


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP4) 橋梁下部工事  
 工 期 平成27年 3月19日 ~ 平成30年 3月30日  
 施工会社 大成・東洋・大豊特定建設工事共同企業体  
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備や基礎構築（ニューマチックケーソン工法）及び橋脚構築作業を行います。

●工事箇所の詳細図

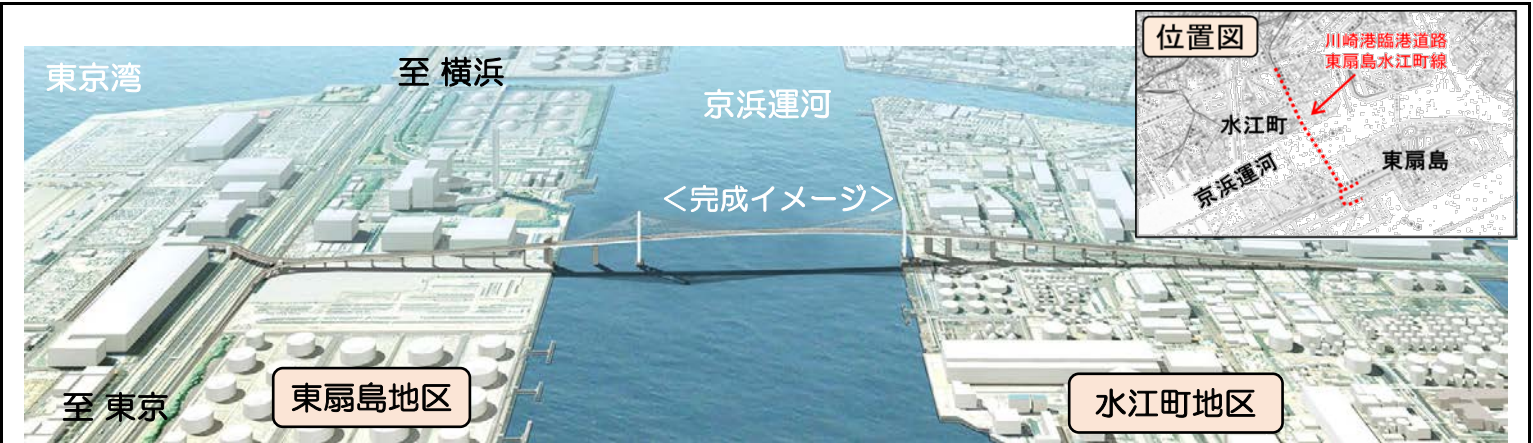

施工箇所平面図

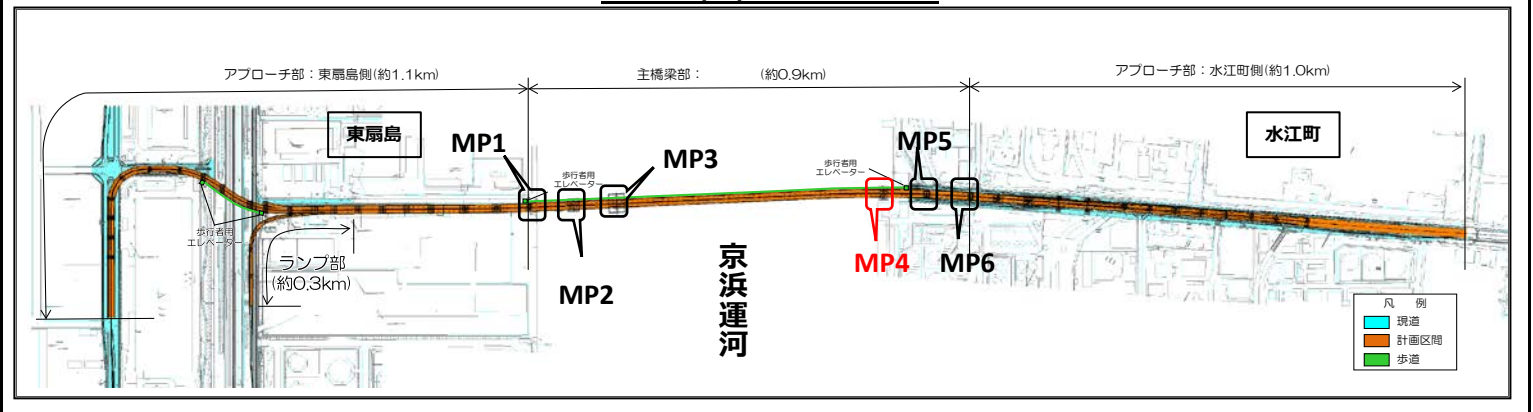

●6月の工事予定

内容	平成29年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
ニューマチックケーソン工							
沈下掘削工							夜間作業
鉄筋組立							
型枠組立							
コンクリート打設							6月15日
型枠脱型							

●お知らせ

作業時間は、原則として昼間は8時から17時、沈下掘削は夜間19時から5時まで。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 4～5月の作業内容

写真①

ニューマチックケーソン工  
(基礎構築工)



躯体（第6-1  
ロット）を構築  
している状況で  
す。

写真②

ニューマチックケーソン工  
(沈下掘削工)



沈下掘削を行っ  
ている作業室内（地  
下）の状況です。
