


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP5・6) 橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月19日～平成30年3月30日
 施工会社 清水・五洋特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備や基礎構築（ニューマチックケーソン工法）及び橋脚構築作業を行います。

●工事箇所の詳細図

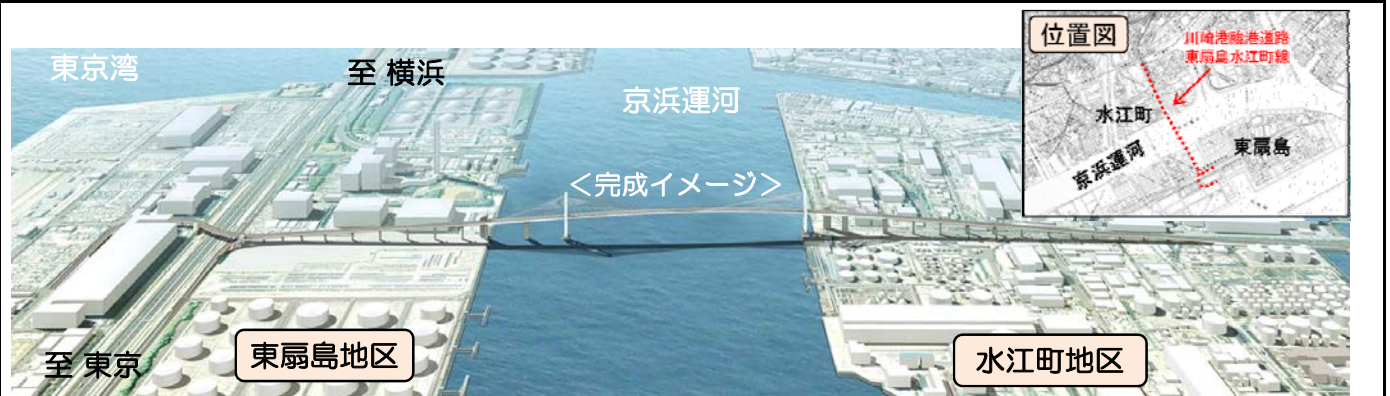

施工箇所平面図

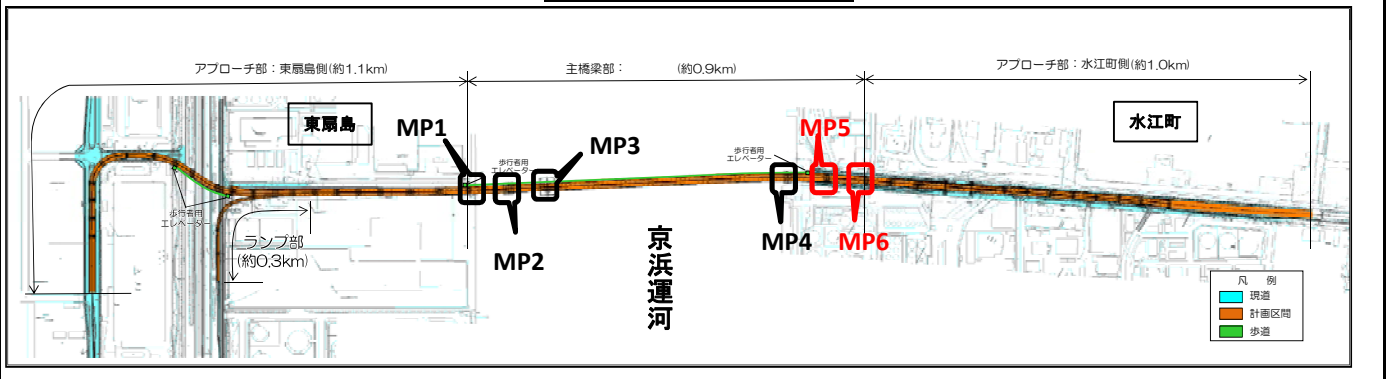

●6月の工事予定

内容	平成29年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
MP5橋脚基礎工							
鉄筋組立	—————						
型枠の設置・脱型				—————			
コンクリート打設						—	6月29日
沈下掘削	—						夜間作業
MP6橋脚基礎工							
鉄筋組立	—————						
型枠の設置・脱型	—				—————		
沈下掘削	—————						夜間作業

●お知らせ

作業時間は、原則として昼間は8時から17時、沈下掘削は夜間19時から5時まで。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 4～5月の作業内容

写真①



MP5コンクリート
打設状況です。

写真②



MP5・6全景
手前がMP5、奥
がMP6です。
