


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP2) 橋梁下部工事  
 工 期 平成27年3月4日～平成30年3月30日  
 施工会社 五洋・清水特定建設工事共同企業体  
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、橋脚の基礎部分の掘削とそれに伴う支保工を行っています。

● 工事箇所の詳細図

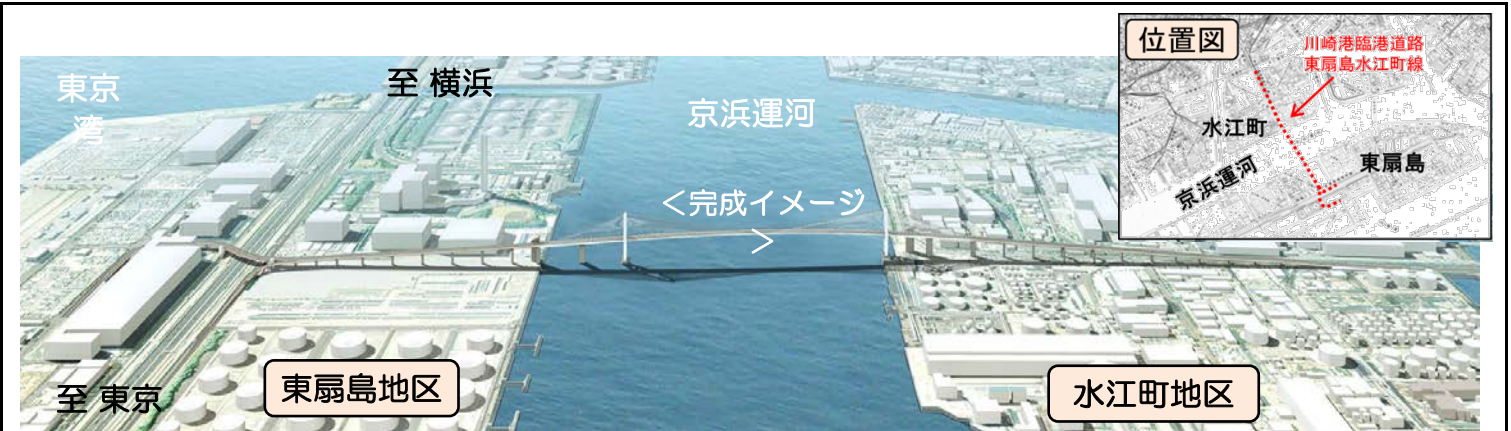

施工箇所平面図

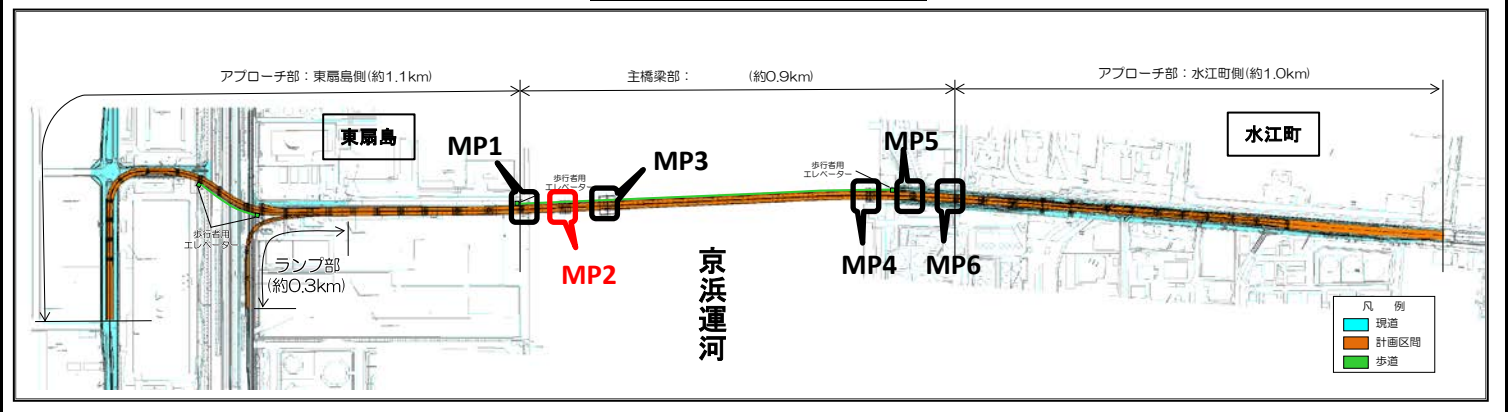

● 9月の工事予定

内容	平成29年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
基礎・橋脚工							
井筒基礎内支保設置							
井筒基礎内掘削							

● お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は8時から17時、海上作業は日の出から日没となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 7~8月の作業内容

写真①



鋼管矢板井筒内  
基礎支保工が4  
段目まで設置さ  
れた状況です。

写真②



鋼管矢板井筒  
基礎内の掘削  
状況です。
