


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP4)橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月19日 ~ 平成30年3月30日
 施工会社 大成・東洋・大豊特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は海上に橋脚とその基礎を構築する工事で、16ロットに分けて構築します。現在10ロットまでの構築を完了し、11ロット目の構築作業を行っています。

工事箇所の詳細図

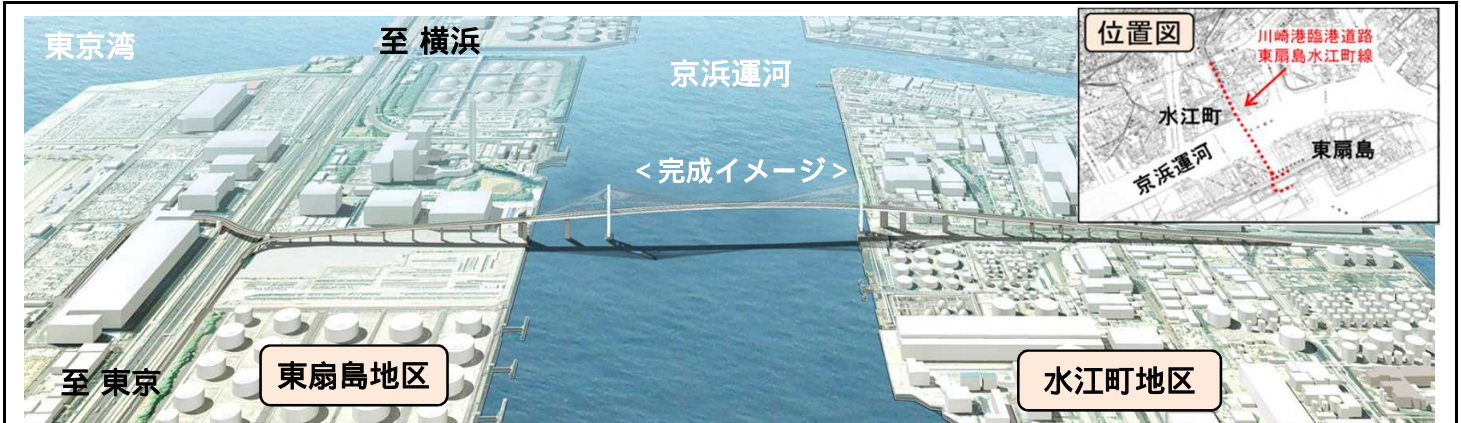

施工箇所平面図

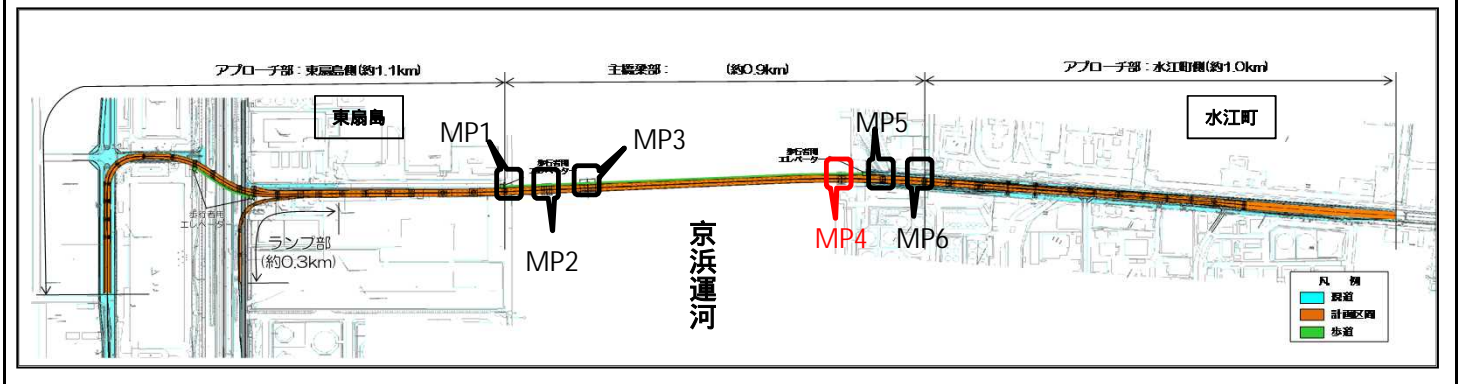

3月の工事予定

内容	平成30年3月						備考
	5	10	15	20	25	31	
ニュー・マッチケーソン工							
沈下掘削工							
内部足場解体							
頂版型枠組立							
頂版支保工設置							
型枠脱型							

お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は昼間8時から19時、沈下掘削は夜間19時から5時まで。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 1～2月の作業内容

写真



ニューマチックケーソン工
(基礎構築工)

躯体構築(第11
- 1ロット)のコン
クリート打設を
行っている状況で
す。

写真



ニューマチックケーソン工
(沈下掘削工)

掘削土排出用の
シャフトを艀装して
いる状況です。
