



京浜港湾事務所

工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部上部工事
 工期 令和2年8月6日 ～ 令和5年12月28日
 施工会社 J F E ・ 日立特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、川崎港臨港道路東扇島水江町線整備におけるアプローチ部の東扇島側鋼上部工を施工するものです。工区は大きく分けて4工区 (SP10-SP13橋脚/橋長：130.5m) 5工区 (SP13-MP1橋脚/橋長：384.0m) OFF工区 (A1R橋台-SP11橋脚/橋長：166.0m) に分けて施工します。

●本工事の施工記録



全景 (4工区～OFF工区)
令和5年3月



全景 (4工区～5工区)
令和5年4月



全景 (4工区～OFF工区)
令和5年5月



全景 (OFF工区)
令和5年6月

●進捗状況・お知らせ

現在、橋梁工事は主桁架設完了して、塗装、巻立てコンクリートを施工中です。6月より床版工を施工します。




川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
測量・調査・設計 (施工検討含む)															
用地取得調整・工作物移設															
関係者調整等 (近接施工・上部工施工)															
施工															

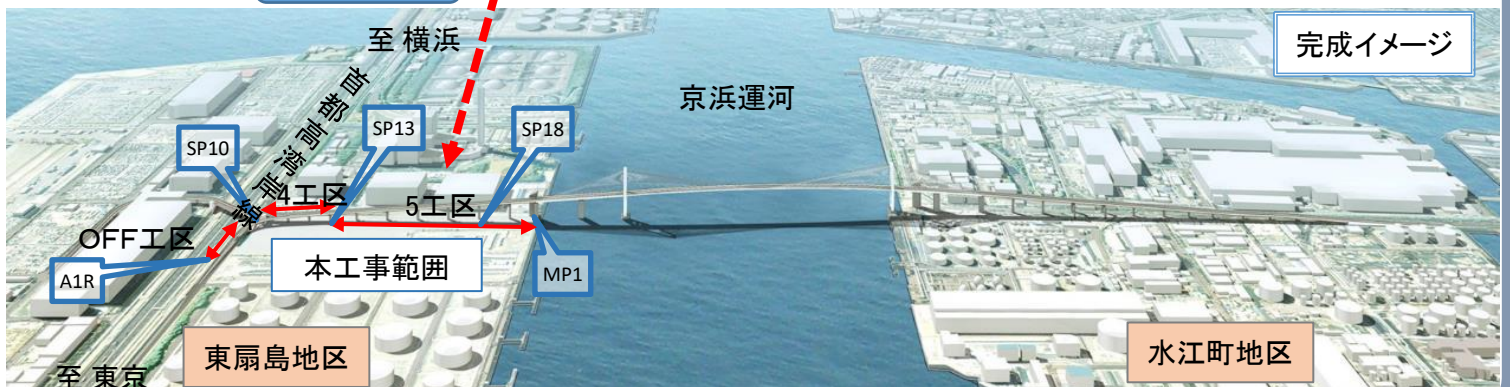

川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部上部工事



OFF工区
R5.3月～4月



現場の別の場所で組み立てた大ブロックを運搬中。長さ44m 重さ 190t

夜に国道を通行止めして大型のクレーン2台で橋桁



4工区
R5.5月現在

5工区
R5.5月現在



橋の骨組みが完成しました。これから床（床版工）を載せてコンクリートを打ちます。

