



京浜港湾事務所

工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部上部工事
工期 令和2年8月6日 ～ 令和5年12月28日
施工会社 JFE・日立特定建設工事共同企業体
工事内容 本工事は、川崎港臨港道路東扇島水江町線整備におけるアプローチ部の東扇島側鋼上部工を施工するものです。工区は大きく分けて4工区(SP10-SP13橋脚/橋長：130.5m) 5工区(SP13-MP1橋脚/橋長：384.0m) OFF工区(A1R橋台-SP11橋脚/橋長：166.0m)に分かれて施工します。

●本工事の施工記録



全景(4工区)
 床版コンクリート打設後
 令和5年10月



全景(5工区)
 合成床版パネル設置・鉄筋組立
 令和5年10月



全景(OFF工区)
 壁高欄鉄筋組立等橋面工
 令和5年10月

●進捗状況・お知らせ

現在、橋梁工事は床版工を施工しています




川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図




▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
測量・調査・設計(施工検討含む)																			
用地取得調整・工作物移設																			
関係者調整等(近接施工・上部工施工)																			
施工																			

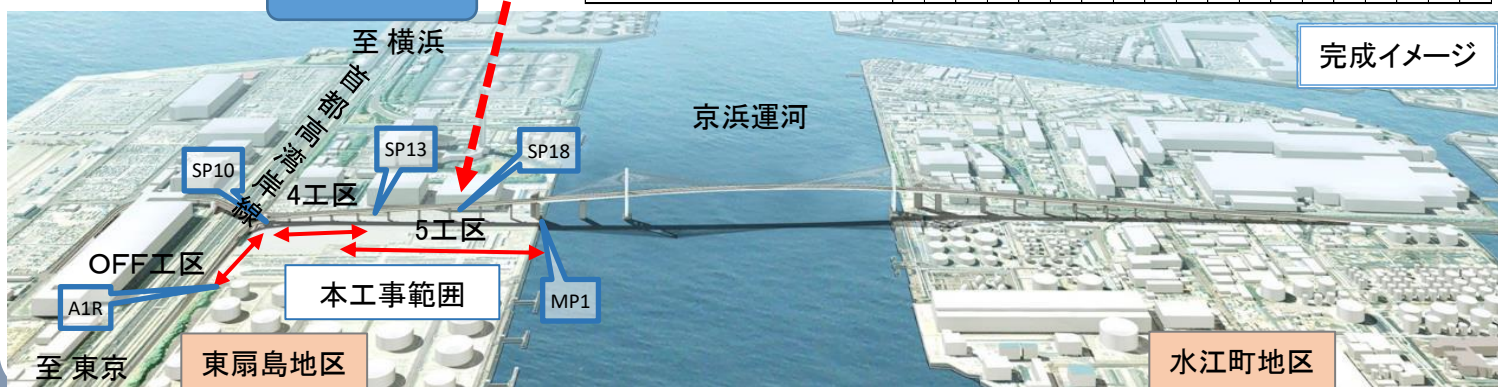

川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部上部工事



施工状況

OFF工区



アームの長さ36m

床版コンクリート打設はアームの長いポンプ車を使って生コンクリートを運びます



合成床版パネルと鉄筋を組上げ、いよいよ床版コンクリートの打設です、ポンプ車で橋上に運び打設後にたくさんの職人さんがコンクリート表面を均し仕上げます



4工区
R5.7月現在

5工区



合成床版パネル搬入

製作工場から陸路で合成床版パネルを建設現場へ持ってきました



合成床版パネル架設

地上で合成床版パネルを組み立てたものをクレーンで吊り上げて所定の場所へ設置します

