


横浜臨港道路南本牧ふ頭・本牧線

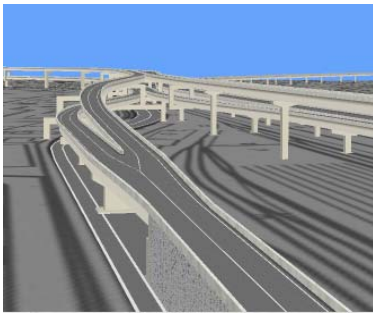

工事名 南本牧ふ頭・本牧線地盤改良等工事

工期 平成22年5月28日～平成23年2月25日

施工会社 日本海工株式会社


工事内容 臨港道路南本牧ふ頭側盛土部直下の地盤を改良するものです。併せて工事により通行が出来なくなる道路を切り回します。

●工事箇所の詳細図

今月は、地盤改良工事に先立ち、路盤直下にある固化版を削孔し、地盤改良杭を施工できるようにします。

必要理由

改良地盤の上部に3mのセメントが配合された固化版があり、地盤改良杭の施工機械では掘削が不可能なため、先行して改良杭施工位置を掘削し砂に置き換えるものです。




アースオーガによる先行削孔



施工位置

施工平面図

先行削孔施工

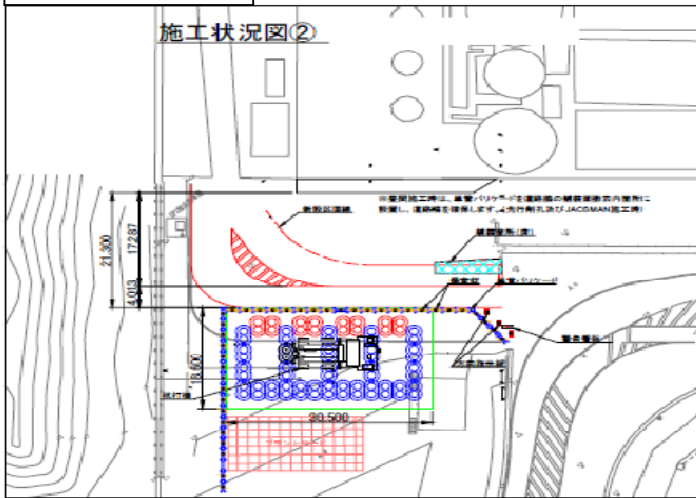

作業状況写真



●今月の工事予定

| 内容 | 平成22年11月 | | | | | | 備考 |
|------------------|----------|----|----|----|-----|-----|----|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 先行削孔 | | | | | | | |
| アースオーガ作業 | 作業中 | | | | | | |
| 置換砂施工 | 作業中 | | | | | | |
| 地盤改良工 | | | | | | | |
| 機械運搬・組立 | | | | | 作業中 | | |
| JACSMAN工法 | | | | | | 作業中 | |
| 昼間作業(7:00~18:00) | | | | | | | |

●お知らせ

作業時間は、月～金曜日 昼間:7時から18時となります。
第2ブロックへの進入路が変更となっていますので、利用者の皆様には、大変ご不便をお掛けしますが、工事のご理解とご協力の程よろしくお願ひします。
