



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(工区)PC栈橋築造・仮設栈橋栈台撤去工事
 工 期 平成26年 8月 7日～平成27年 7月 9日
 施工会社 五洋建設株式会社
 工事内容 横浜港臨港道路の整備工事として栈橋構造で7径間連続PC桁橋を築造する工事です。また、本工事で使用した、仮設栈橋および栈台等を撤去する工事です。

工事箇所の詳細図



今月の工事予定

内容	平成27年3月						備考
	5	10	15	20	25	30	
PC橋工							
受梁工							
PC桁製作							工場製作
構造物撤去工							
解体ヤード準備工							
作業員通路, 栈台撤去準備							
作業員通路, 栈台撤去							
作業員通路, 栈台解体							


お知らせ

作業は原則として月曜日から金曜日としています。場合によっては土曜日、日曜日に作業を行うこともあります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

今月の作業内容

PC橋工
受梁工 組立状況

写真



現在は、PC桁を架設する為の受梁工を行っています。
受梁は鋼管杭に、支保工、鉄筋、型枠、コンクリート打設へと進めます。

(写真 作業全景)


構造物撤去工
仮設栈台撤去状況

写真



3月より
撤去

□ : 撤去 済

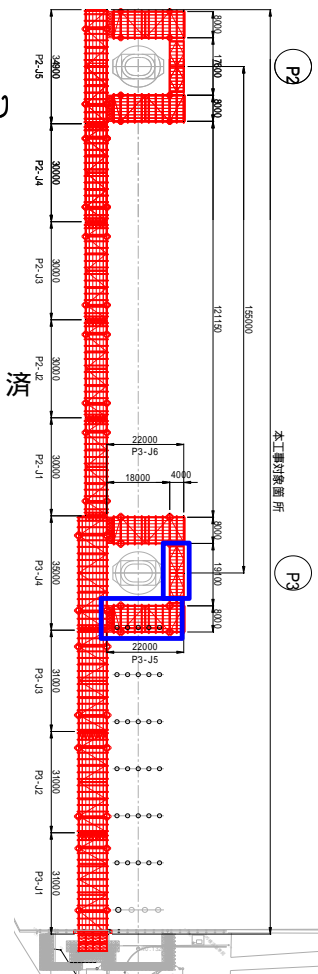

南本牧臨港道路（工区）における橋脚およびPC桁橋の築造
工事に伴い、仮設通路として使用していた仮設栈橋の撤去を行
います。写真は、昨年12月にP3橋脚付近の仮設栈台を撤去
している状況ですが、今月から同様にP2橋脚付近から撤去しま
す。

(写真 作業全景)
