



京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(Ⅲ-2工区)高架橋上部工事  
 工期 平成26年7月14日～平成28年7月4日  
 施工会社 宮地・MMB特定建設工事共同企業体  
 工事内容 4径間連続鋼床版箱桁(上り線・下り線)の工場製作、架設、現場溶接、現場塗装、壁高欄ほか

下記の工場では、桁製作が終わり塗装作業を行っています。塗装の終わった桁を工場から順次、現場に輸送しています。

- ・宮地エンジニアリング(株) 千葉工場
- ・エム・エムブリッジ(株) 千葉工場

架設現場では、昼間に工場から輸送された桁を荷卸して架設の準備作業(仮組立)を行い、夜間にベントの設置と桁架設作業を行っています。

施工位置図



Ⅲ-2工区  
 (橋長上り線289m, 下り線291m)  
 鋼4径間連続鋼床版箱桁橋

桁搬入・荷卸




ベント設置



仮組立



桁架設

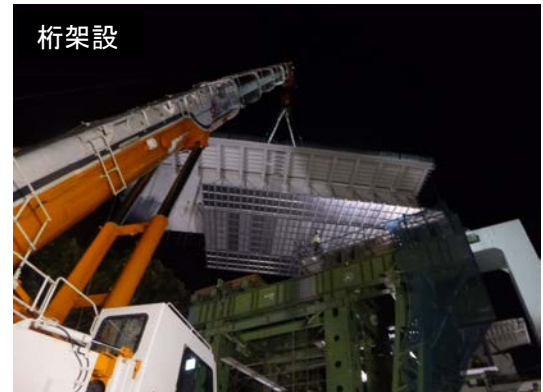

内容	平成27年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
(工場製作)							
工場塗装工							
桁輸送工							
(現場)							
桁地組立工							
ベント設置工							夜間作業
桁架設工							夜間作業
足場等設置工							夜間作業

●お知らせ

先月から工場で作成した桁を輸送し、現場でベントの設置および桁架設作業を開始しています。

ベント設置・桁架設作業は日曜日を除く夜間22:30～6:00に市道52号線を通行止めもしくは車線規制を行い作業します。

近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

写真① 今月の作業内容

写真① 架設現場状況



緑色の部材がベント設備です。ベント設備とは、桁のボルト締付や桁の位置調整等が終わるまでの間、桁を仮受する設備のことです。

手前にある大型クレーンでベントの設置や桁の架設作業を行っています。

写真② 夜間桁架設状況



夜間の桁架設作業は、11月初旬まで行う予定です。
