



埋立部外周護岸のケーソンをわずか2週間で10函据付完了

- ・平成20年7月18日から31日の2週間で、ケーソン10函の据付を完了。
- ・D滑走路先端部の進入灯橋梁の取付部護岸及び船舶を接岸させ物資の荷揚げを行うための物揚場護岸にケーソン式護岸を採用している。
- ・10月には、埋立部外周護岸が概成する予定。(現在、捨石マウンドの進捗約60%)

外周部護岸 (L=約4,500m)

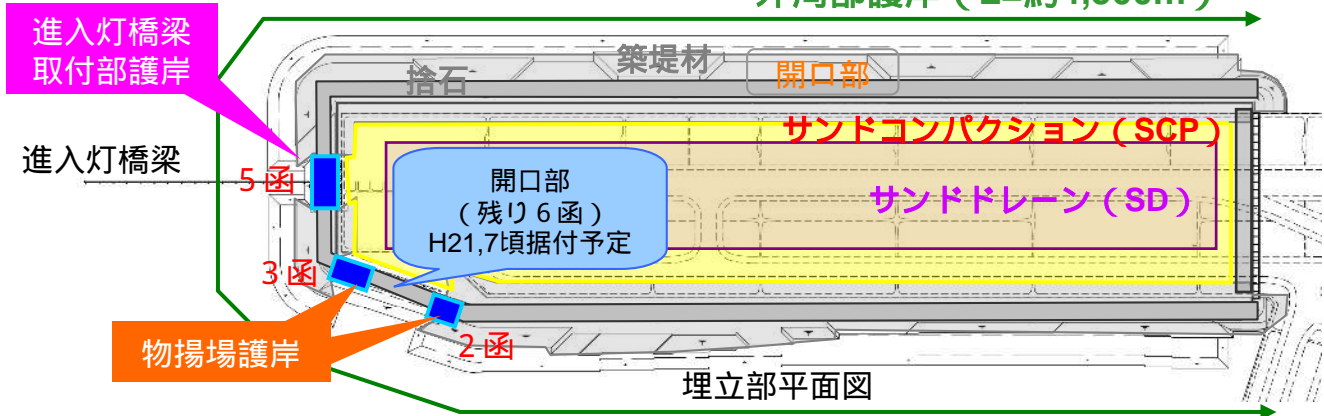

ケーソン護岸全景

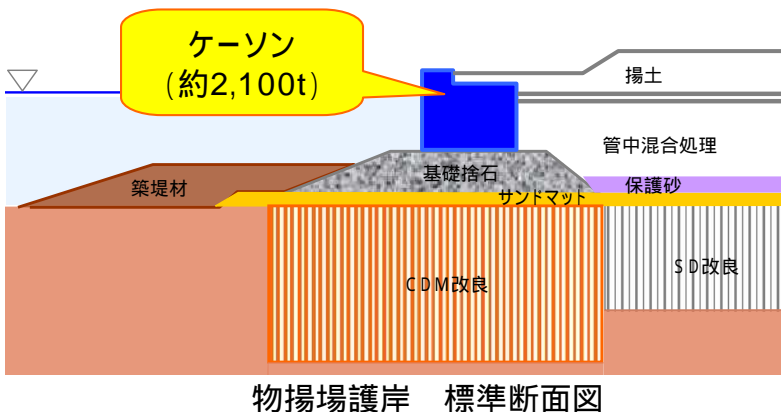

ケーソンとは、中空箱型形状のコンクリート製の大型ブロックのこと。

