




京浜港湾事務所

工事名 横浜港南本牧地区岸壁(-16m) (耐震) 中仕切護岸築造工事
 工期 平成22年6月18日～平成23年3月18日
 施工会社 東洋・不動テトラ特定建設工事共同企業体
 工事内容 南本牧MC3とMC4の境にケーソンを据付けて、中仕切を行う工事です。

●工事箇所の詳細図

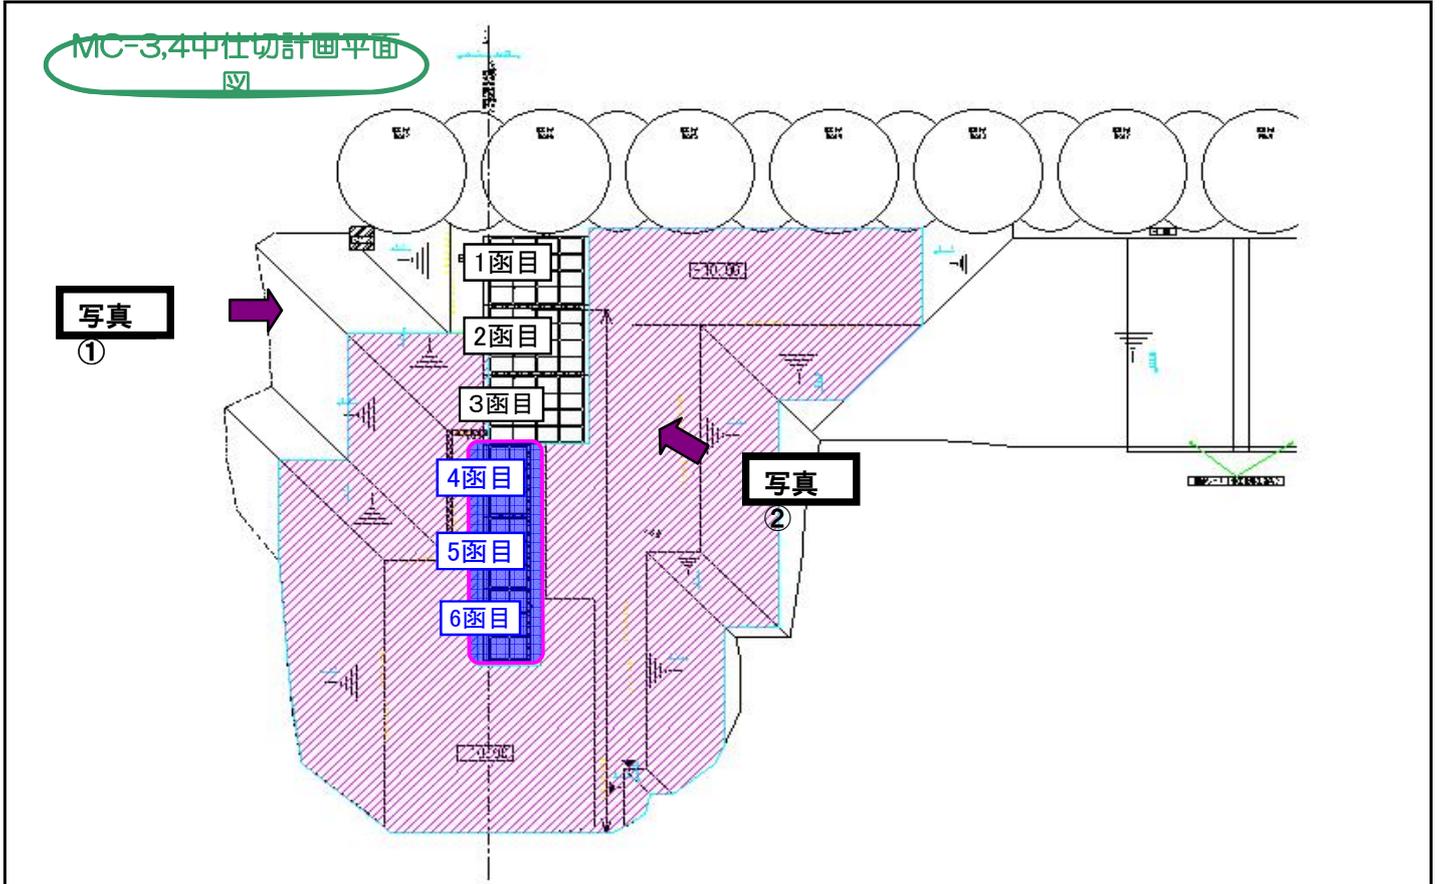

●今月の工事予定

内容	平成22年10月						備考
	5	10	15	20	25	30	
ケーソン基礎捨石工	■			■			
ケーソン裏込捨石工	■						
ケーソン基礎捨石均し工				■			
ケーソン据付工						■	

●お知らせ

今回のケーソン据付(3函)は、10月27日～29日となります。

写真① 先月までの作業内容



ケーソンの基礎となる捨石をガット船で-20mの深さまで投入してマウンドを築造します。

写真② 先月までの作業内容



-20mまでのマウンド築造が完了後、ケーソン（約3800 t）の据付を行い、中仕切護岸の第1段階での施工が完了しました。
